



Rajkiya Engineering College, Ambedkar Nagar (U.P.) - 224122
Department of Civil Engineering

पत्रांक: REC/CED/010925/05

दिनांक: 01/09/2025

सेवा में,

अधिशाषी अभियंता,
यू०पी०आर०एन०एस०एस०,
निर्माण प्रखंड- आजमगढ़,
जनपद- आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

विषय: निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़ में 03 क्लास रूम का निर्माण एवं फर्नीचर संबंधी कार्य की तृतीय पक्ष संपरीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या: यू०पी०आर०एन०एस०एस०/आज०/265/2025-26, दिनांक: 01.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़ में 03 क्लास रूम का निर्माण एवं फर्नीचर संबंधी कार्य की तृतीय पक्ष संपरीक्षा किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में दिनांक: 24.08.2025 को उक्त निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद,

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अवनीश कुमार यादव)

मुख्य अन्वेषक एवं सहायक आचार्य
सिविल इंजीनियरिंग विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग

(अवनीश कुमार यादव)

मुख्य अन्वेषक एवं सहायक आचार्य
सिविल इंजीनियरिंग विभाग।

तृतीय पक्ष संपरीक्षा (थर्ड पार्टी जाँच) आख्या

अधिशाषी अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०), निर्माण प्रखंड- आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के पत्र संख्या: यू०पी०आर०एन०एस०एस०/आज०/265/2025-26, दिनांक: 01.08.2025 के क्रम में तृतीय पक्ष संपरीक्षा (थर्ड पार्टी जाँच) हेतु राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अम्बेडकर नगर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के श्री अवनीश कुमार यादव (सहायक आचार्य एवं मुख्य अन्वेषक) एवं श्री अमित कुमार राय (सहायक आचार्य एवं सह-मुख्य अन्वेषक) द्वारा दिनांक: 24.08.2025 को निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़ में 03 क्लास रूम का निर्माण एवं फर्नीचर संबंधी कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में श्री शहबाज़ आलम (अवर अभियंता) उपस्थित रहे।




निरीक्षण के समय उक्त निर्माणाधीन परियोजना के अंतर्गत किये गए निर्माण कार्यों की बिंदुवार आख्या निम्नवत है-

(A) 03 नग क्लासरूम -

- (1) प्रथम तल पर बने 01 नग क्लासरूम व द्वितीय तल पर बने 02 नग क्लासरूम का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण, दीवार की आंतरिक एवं बाह्य सतहों पर प्लास्टर, पुट्टी व पेंट का कार्य पूर्ण है।
- (2) सभी क्लासरूम की फर्श पर विट्रीफाइड टाइल्स एवं आंतरिक दीवारों पर Wall Tiles (05 फीट ऊँचाई) लगाने का कार्य भी पूर्ण है।
- (3) कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में निर्मित भवनों में लगी खिड़कियों से एकरूपता बनाए रखने के दृष्टिगत सभी क्लासरूम की खिड़कियों में Z-section के स्थान पर Wooden फ्रेम व पल्ले लगाए गए हैं, जिनकी पेंटिंग का कार्य पूर्ण पाया गया। Double leaf doors एवं खिड़कियों में ग्रिल लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है।
- (4) इलेक्ट्रिकल वाइरिंग का कार्य पूर्ण है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स (पंखे, ट्यूबलाइट, आदि) लगाए जाने का कार्य शेष है।
- (5) क्लासरूम के सामने बने गलियारे की फर्श पर विट्रीफाइड टाइल्स लगाने का कार्य भी पूर्ण है।



(B) Staircase, ममटी निर्माण, फायर फाइटिंग एवं अन्य कार्य-

- (1) भवन के द्वितीय तल से छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर ग्रेनाइट स्टोन एवं स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगाने का कार्य एवं ममटी का निर्माण कार्य पूर्ण है। ममटी में दरवाजा लगाए जाने का कार्य शेष है।
- (2) भवन के द्वितीय तल पर Fire Fighting सम्बन्धी कार्य भी पूर्ण पाया गया।
- (3) भवन की छत पर ब्रिक कोबा का कार्य, ब्रिक पैरापेट का कार्य एवं PVC वाटर टैंक को लगाने एवं उनके कनेक्शन का कार्य पूर्ण है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु कनेक्शन आदि का कार्य पूर्ण है।
- (4) कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वाटर कूलर एवं साउंड सिस्टम की आपूर्ति की जा चुकी है, केवल इंस्टालेशन का कार्य किया जाना शेष है।

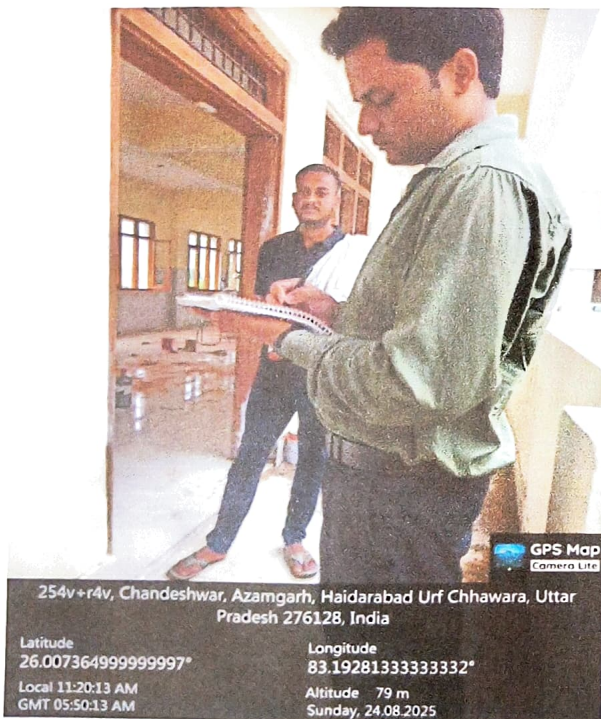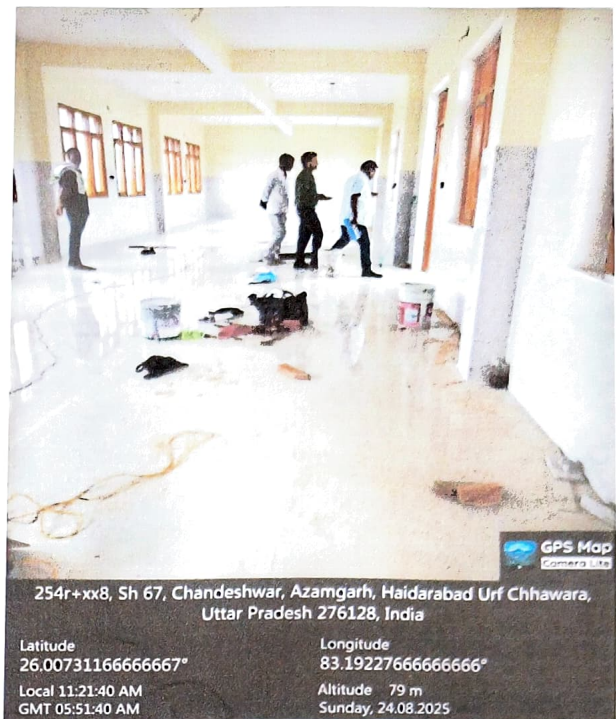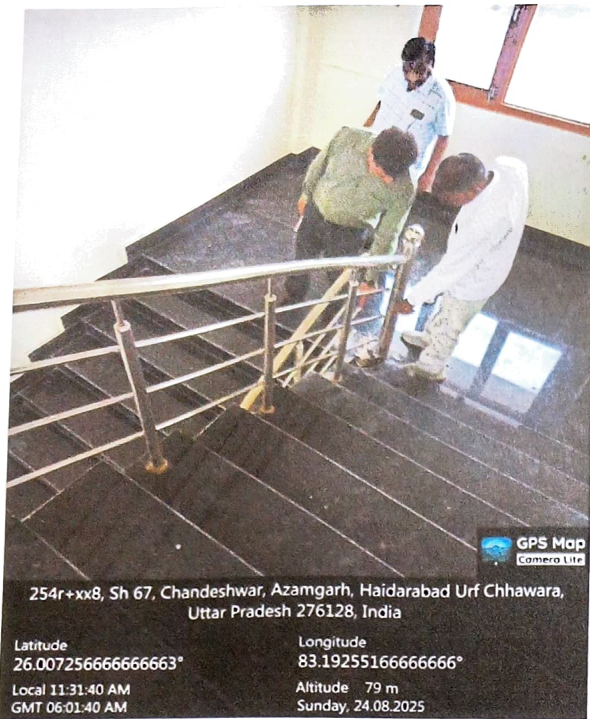

निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़ में 03 क्लास रूम का निर्माण एवं फर्नीचर संबंधी कार्य का स्थलीय निरीक्षण

Ant *Akshar*

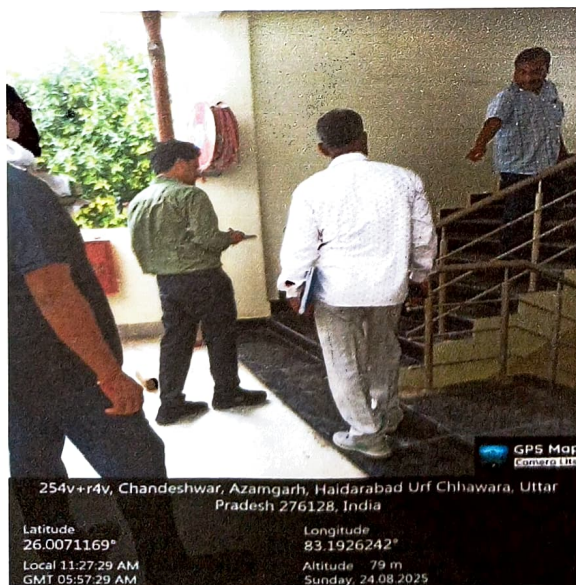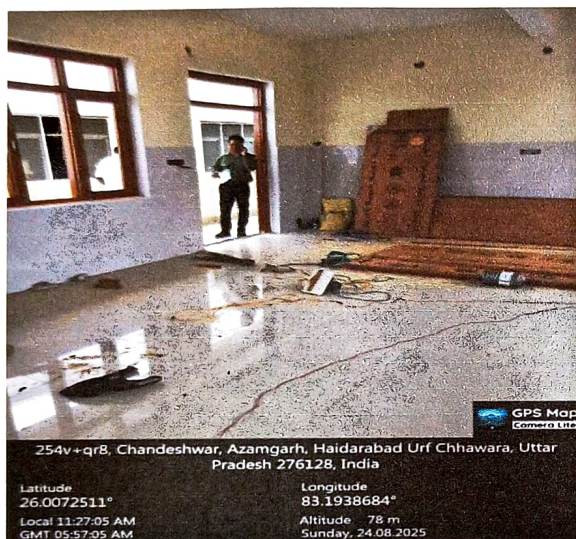

निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल एवं अस्पताल, चण्डेश्वर, आजमगढ़ में 03 क्लास रूम का निर्माण एवं फर्नीचर संबंधी कार्य का स्थलीय निरीक्षण

Ant *Shan*

उपरोक्त समस्त निर्माण कार्यों के भौतिक स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रथमदृष्टया निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक है तथा सिविल कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 169.52 लाख (सेंटेज, GST, आदि को छोड़कर) के सापेक्ष निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 90 प्रतिशत है।



(अमित कुमार राय)

सह- मुख्य अन्वेषक



(अवनीश कुमार यादव)

मुख्य अन्वेषक
