

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम—जनपद बिजनौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर के परिसर में 25 नग क्लारुम का निर्माण कार्य।

शासनादेश संख्या—104/2024/आई/518249/005-89-1002(002)/1/2023 व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2024।

कार्यदायी संस्था—यू0पी0आर0एन0एन0एन0, बिजनौर।


कार्य प्रारम्भ करने की तिथि—01 जुलाई, 2024।

स्वीकृत लागत—488.98 लाख।

अवमुक्त धनराशि—रु0-446.46 लाख।


कुल व्यय धनराशि—446.46 लाख।

जनपद बिजनौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर के परिसर में 25 नग क्लारुम का निर्माण कार्य का स्थलीय सत्यापन कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्रांक रा0औ0प्र0स0/निर्माण/टास्क समिति / 2025-26/644 दिनांक 12.08.2025 के आदेश के क्रम में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 01.11.2025 को उपरोक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन किया गया। सत्यापन के समय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर के प्रधानाचार्य व कार्यदायी संस्था के अवर अभियंता, सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता उपस्थित रहें। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की कुल स्वीकृत लागत धनराशि रु0 488.98 लाख है। जिसमें 25 नग क्लारुम भवन (जी+2) व रेनवाटर हारवेस्टिंग 02 नग के निर्माण कार्यों का प्राविधान है। स्वीकृत लागत रु0 488.98 लाख के सापेक्ष में कार्यदायी संस्था को वर्तमान तक धनराशि रु0 446.46 लाख अवमुक्त की गयी है। निरीक्षण के दौरान परियोजना के प्राविधानित कार्यों में 25 नग क्लारुम भवन के फर्श में टाइल्स व कोटा स्टोन लगाने का कार्य, आन्तरिक विद्युतिकरण का कार्य, छत पर ब्रिक कोबा कार्य कार्य पूर्ण व पेन्टिंग कार्य प्रगति पर पाया गया।

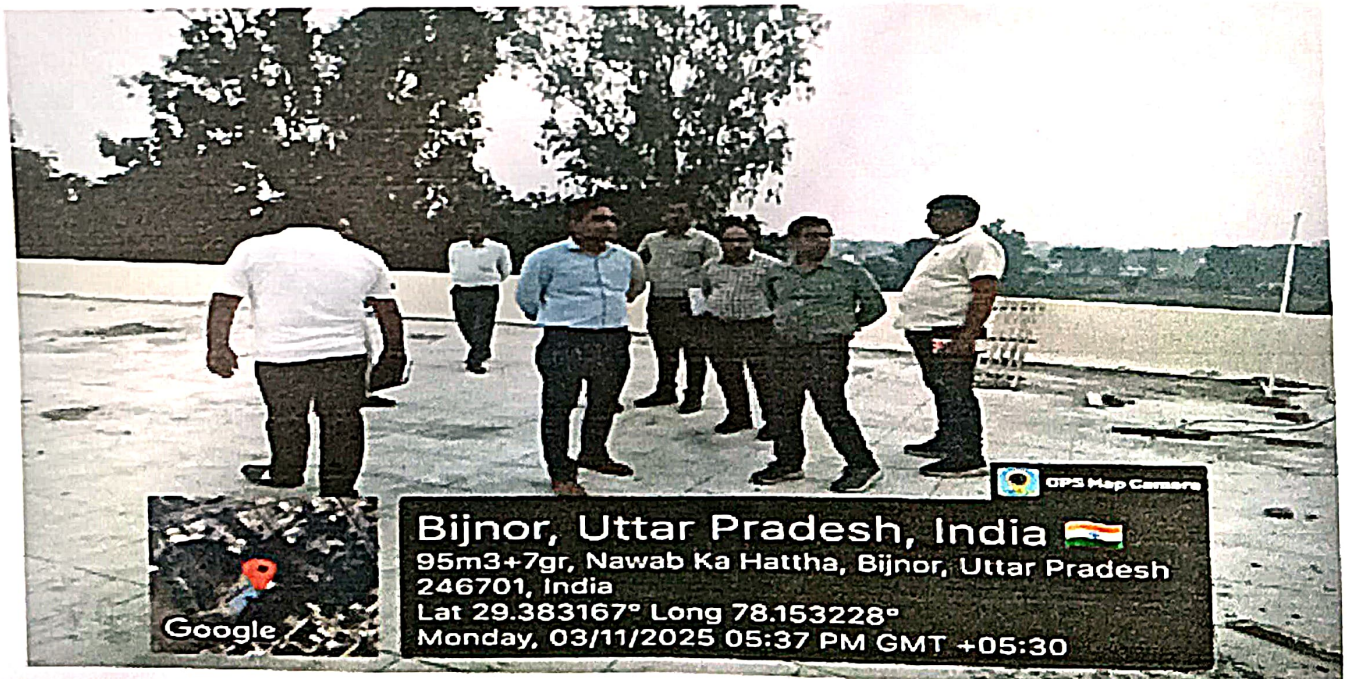

श्रीरं: पूरु संख्या 02 पर...

(9)

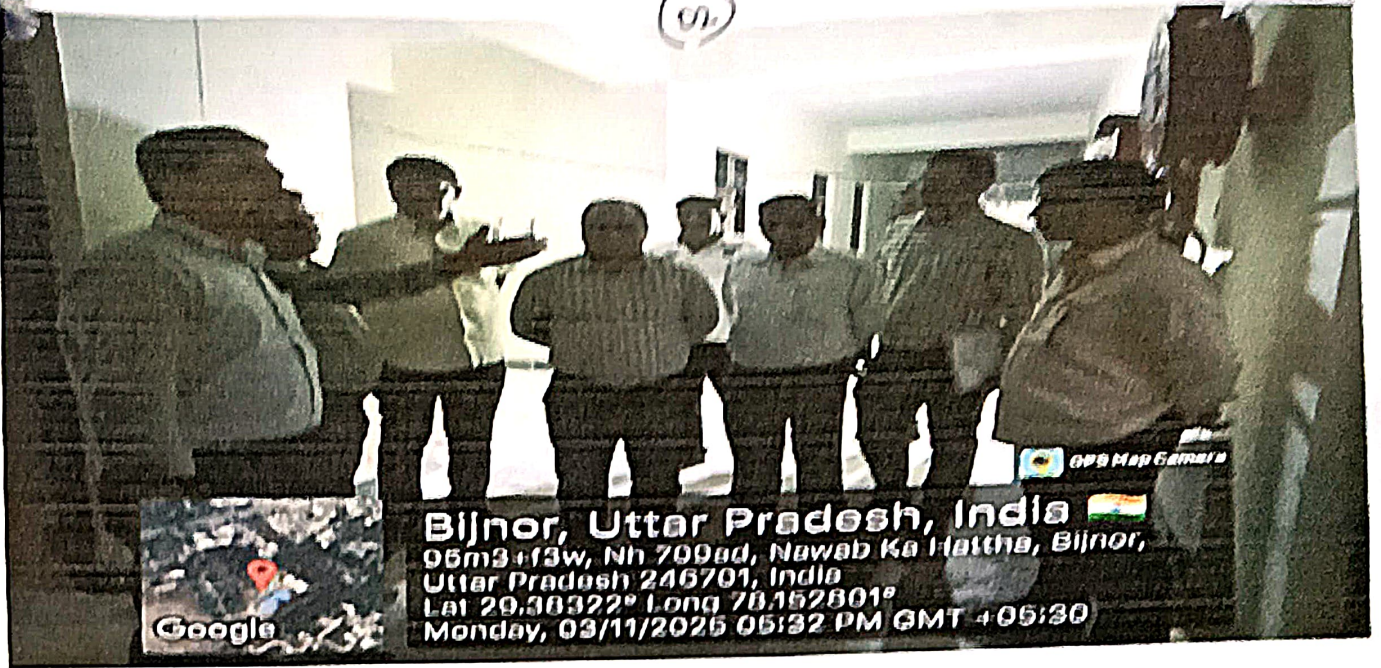

वर्तमान में प्राप्त घनराशि को सापेक्ष में वित्तीय प्रगति 100 प्रतिशत एवं भौतिक प्रगति लगभग 95 प्रतिशत है। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक है।

not
अधिशारी अभियंता
ग्रामीण अभियन्तण विभाग
बिजनौर

lu
अधिशारी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
बिजनौर।
