

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम	-जनपद विजनौर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चोंदपुर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।
शासनादेश संख्या	- 948/सोलह-1-2017-9(बजट-23)/2016 टीसी दिनांक 16 मार्च, 2016
मूल स्वीकृत लागत	-809.09 लाख।
पुनरीक्षित लागत	-936.30+109.51(G.S.T.)=1045.81 लाख।
व्यय धनराशि	-1045.81 लाख।

उक्त कार्य शासनादेश संख्या 948/सोलह-1-2017-9(बजट-23)/2016 टीसी दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परियोजना की मूल स्वीकृत लागत 809.09 लाख व शासनादेश संख्या 2111/सोलह-1-2019-9(बजट-23)/2016 टीसी दिनांक 08 जुलाई, 2019 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु 936.30 लाख +G.S.T. एवं जी0एस0टी0 के मद की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 39/2024/775686/2024/161002/18/2020 दिनांक 21.10.2024 को 109.51 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 202.48 लाख दिनांक दिनांक 30.08.2017, द्वितीय किस्त 202.47 लाख दिनांक 04.01.2018, तृतीय किस्त 136.46 लाख दिनांक 02.05.2018, चतुर्थ किस्त 160.00 लाख दिनांक 25.08.2019 एवं पंचम किस्त 234.89 लाख दिनांक 25.04.2020 एवं जी0एस0टी0 के मद में 109.51 लाख के सापेक्ष में 65.71 लाख दिनांक 26.03.2025 को व 43.80 दिनांक 26.09.2025 को कुल प्राप्त धनराशि रु 1045.81 लाख कार्यदायी संस्था को निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी महोदय विजनौर के कार्यालय के आदेश सं 697/नि0का0सत्या0/2022-23 दिनांक 10.10.2022 एवं कुल सचिव महोदय राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चोंदपुर विजनौर के पत्रांक संख्या रा0इ0का0/स्थापना/2214 दिनांक 10.10.2025 के परिपालन में दिनांक 12.12.2025 को गठित टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था के अवर अभियंता श्री आशीष कुमार उपस्थित रहे।


उपस्थित अवर अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत प्रावकलन में टाईप-2 आवास तीन ब्लॉक (8x3=24नग), टाईप-3 आवास तीन ब्लॉक (8x3=24नग) एवं टाईप -5 आवास 01 नग वाहय विद्युतिकरण, वाहय जलमल एवं सीवररेज का कार्य सी0सी0रोड, इण्टरलॉकिंग टाइल्स, बाउंड्रीवाल, रेनवाटर हारवेस्टिंग इत्यादि कार्यो का प्राविधान है। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

निरीक्षण आख्या

1. टाईप -02 आवास तीन ब्लॉक (8x3=24नग)-निरीक्षण के दौरान टाईप -02 के ब्लॉक ए0, बी0 एवं सी0 के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया।
2. स्थल विकास कार्य- निरीक्षण के दौरान प्रावकलन में प्राविधानित स्थल विकास कार्यो के अन्तर्गत वाहय विद्युतिकरण का कार्य, वाहय जलमल एवं सीवररेज का कार्य सी0सी0 रोड, इण्टरलॉकिंग टाइल्स, बाउंड्रीवाल, रेनवाटर हारवेस्टिंग 04 नग, इण्डिया मार्क हैण्डपम्प 01 नग इत्यादि कार्य पूर्ण पाये गये।

क्रमांक: चेन 02 पर.


कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों का परीक्षण नमूना लेकर समय-समय पर लो0नि0विभाग की प्रयोगशाला चोंदपुर से कराया गया है तथा उक्त कार्य का तृतीय पक्ष मूल्यांकन आई0ई0टी0 लखनऊ से भी कराया गया है (छायाप्रति संलग्नक)

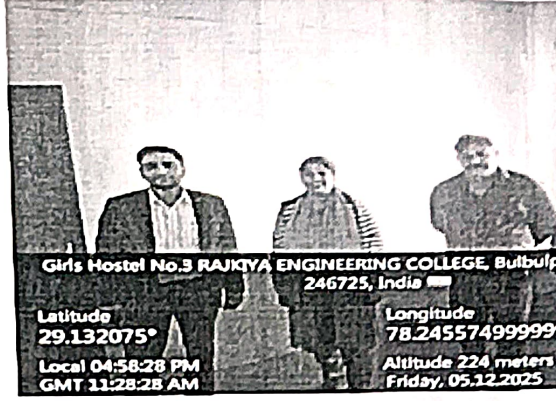

कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक है तथा परियोजना के अवशेष कार्यों को सम्यन्धित विभाग को हस्तान्तरित करने की सस्तुति की जाती है तथा हस्तान्तरण के समय कार्य की इन्वेन्ट्री का मिलान सम्यन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।


अर्थ एवं सख्याधिकारी
विजनौर


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड-लो0नि0विभाग
विजनौर।


अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
विजनौर
