
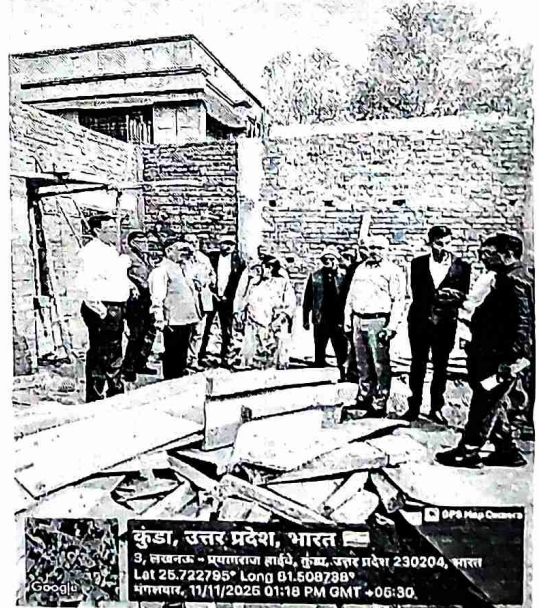


निरीक्षण आख्या

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.11.2025 को उप महानिरीक्षक निबन्धन, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज व तहसीलदार कुण्डा श्री अलख शुक्ला एवं उप निबन्धक कुण्डा श्रीमती राशि अग्रवाल के साथ उप निबन्धक कार्यालय कुण्डा हेतु निर्माणाधीन भवन के गुणवत्ता एवं प्रगति के दृष्टिगत उपभोग प्रमाण की संभावना को देखते हुए औचक निरीक्षण किया गया। जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन उप निबन्धक कार्यालय कुण्डा के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रु0 228.92 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु0 114.48 लाख का उपभोग प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता यूपीआरएनएसएस निर्माण प्रखण्ड प्रयागराज के द्वारा दिनांक: 05.12.2025 को उपलब्ध कराया गया, जिसके जांच में उक्त निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण उप निबन्धक कुण्डा श्रीमती राशि अग्रवाल द्वारा कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता श्री अनूपचन्द पटेल के साथ दिनांक 08.12.2025 को किया गया। कार्यदायी संस्था के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना दिनांक 10.08.2025 को प्रारम्भ किया गया है एवं दिनांक 09.06.2026 तक पूर्ण किया जाना है। कार्य की मूल स्वीकृत लागत रु0-228.92 लाख के सापेक्ष संस्था को रु0-114.48 लाख प्राप्त है। परियोजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष प्रगति निम्नलिखित है।




- मुख्य भवन के सटरिंग का कार्य पूर्ण, रेनफोर्समेंट का कार्य प्रगति पर।
- टायलेट ब्लॉक लिण्टल बैण्ड का कार्य प्रगति पर।
- बाउण्ड्रीवॉल 15 र0मी0 ब्रिक वर्क एवं कॉलम का कार्य प्रगति पर।
- सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का कार्य पूर्ण।
- कैन्टीन के नींव का कार्य पूर्ण, सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर।
- बोरिंग का कार्य पूर्ण।

कार्य को तीव्र गति से किये जाने की आवश्यकता है सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया है कि उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जा रही सामग्रियों का परीक्षण निदेशक नार्थ इण्डिया इंजीनियरिंग लैब एण्ड कन्सल्टेन्ट, रोड नं0- 66 इंडस्ट्रियल स्टोर एम0एन0एन0आई0टी0 प्रयागराज द्वारा पूर्व में कराया जा चुका है। प्रथम दृष्टया कार्य सन्तोष जनक पाया गया।

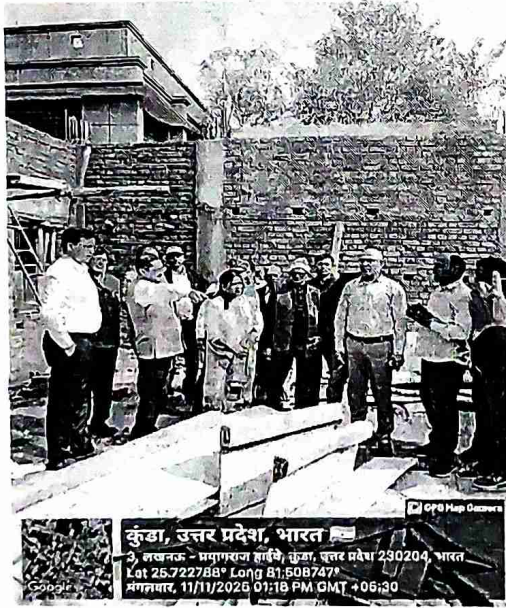

SR (Kunda)

el.

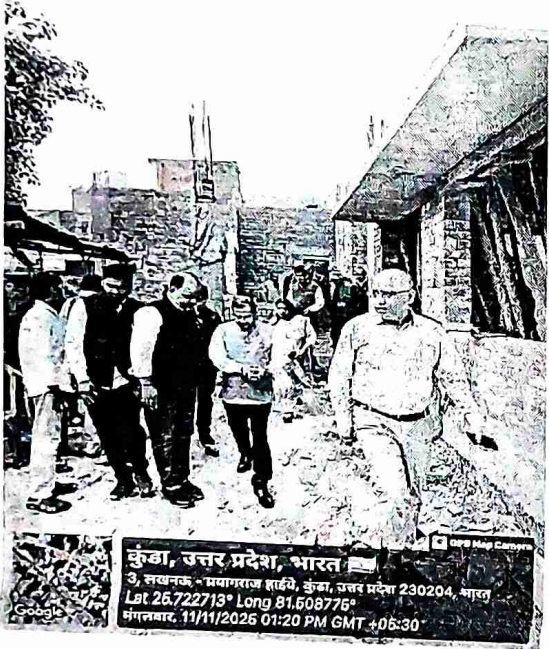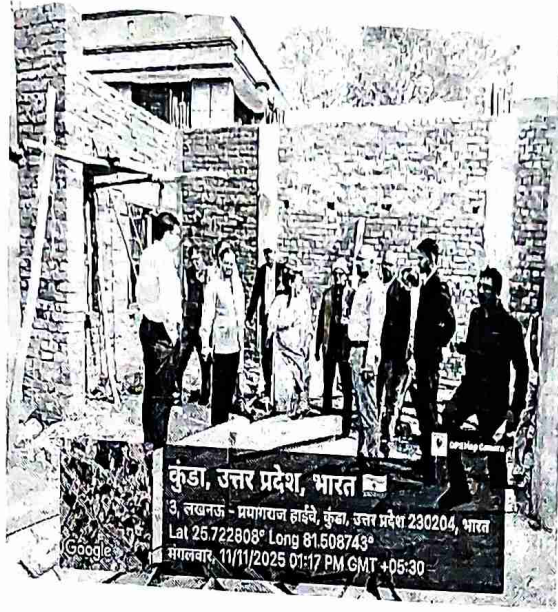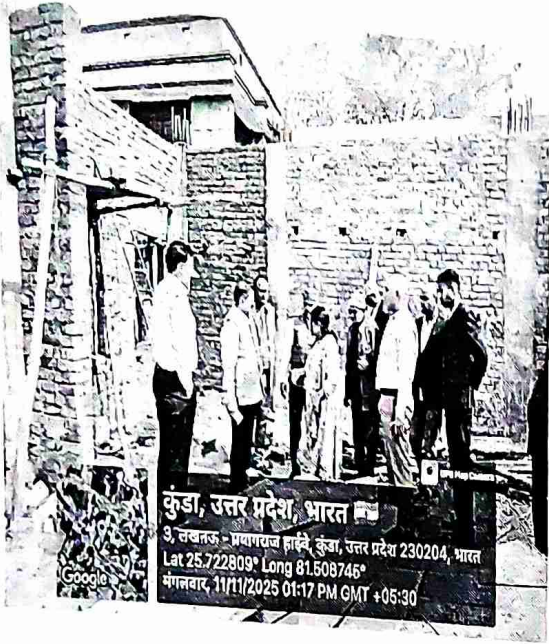

(राशि अग्रवाल)
 उप निबन्धक
 कुण्डा, प्रतापगढ़।

(सादवन्दर द्विवेदी)
 सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
 प्रतापगढ़।
