

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम—जनपद बिजनौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर के परिसर में मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर 01 नग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक 01 नग, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 01 नग, स्विंग टेक्नोलॉजी 01 नग, बेसिक कास्टोमालॉजी 01 नग एवं आई0टी लैब 01 नग नये कार्यशालाओं का निर्माण कार्य।

शासनादेश संख्या— 40/आई/897090/2025/001-89-1002/11/2025 व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2025।

कार्यदायी संस्था—यू0पी0आर0एन0एस0एस0, बिजनौर।


कार्य प्रारम्भ करने की तिथि—21 जुलाई, 2025।

स्वीकृत लागत—496.02 लाख।

अवमुक्त धनराशि रू0—50.02 लाख।

कुल व्यय धनराशि —50.02 लाख।

जनपद बिजनौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर के परिसर में मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर 01 नग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक 01 नग, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 01 नग, स्विंग टेक्नोलॉजी 01 नग, बेसिक कास्टोमालॉजी 01 नग एवं आई0 टी लैब 01 नग नये कार्यशालाओं का निर्माण कार्य का स्थलीय सत्यापन कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्रांक रा0औ0प्र0स0/ निर्माण/टास्क समिति / 2025-26/ 644 दिनांक 12.08.2025 के आदेश के क्रम में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 01.11.2025 को उपरोक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन किया गया। सत्यापन के समय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर के प्रधानाचार्य व कार्यदायी संस्था के अवर अभियंता, सहायक अभियंता तथा अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 496.02 लाख है। जिसमें मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर 01 नग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक 01 नग, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 01 नग, स्विंग टेक्नोलॉजी 01 नग, बेसिक कास्टोमालॉजी 01 नग एवं आई0टी लैब 01 नग नये कार्यशालाओं के निर्माण कार्यों का प्राविधान है। स्वीकृत लागत रू0 496.02 लाख के सापेक्ष में कार्यदायी संस्था को वर्तमान तक धनराशि रू0 50.02 लाख अवमुक्त की गयी है। निरीक्षण के दौरान परियोजना के प्राविधानित कार्यों में से आई0टी0लैब को छोड़कर शेष कार्यशालाओं का निर्माण कार्य सुपर स्ट्रक्चर में कॉलम का आर0सी0सी0 कार्य व चिनाई कार्य छत स्तर तक प्रगति पर पाया गया।

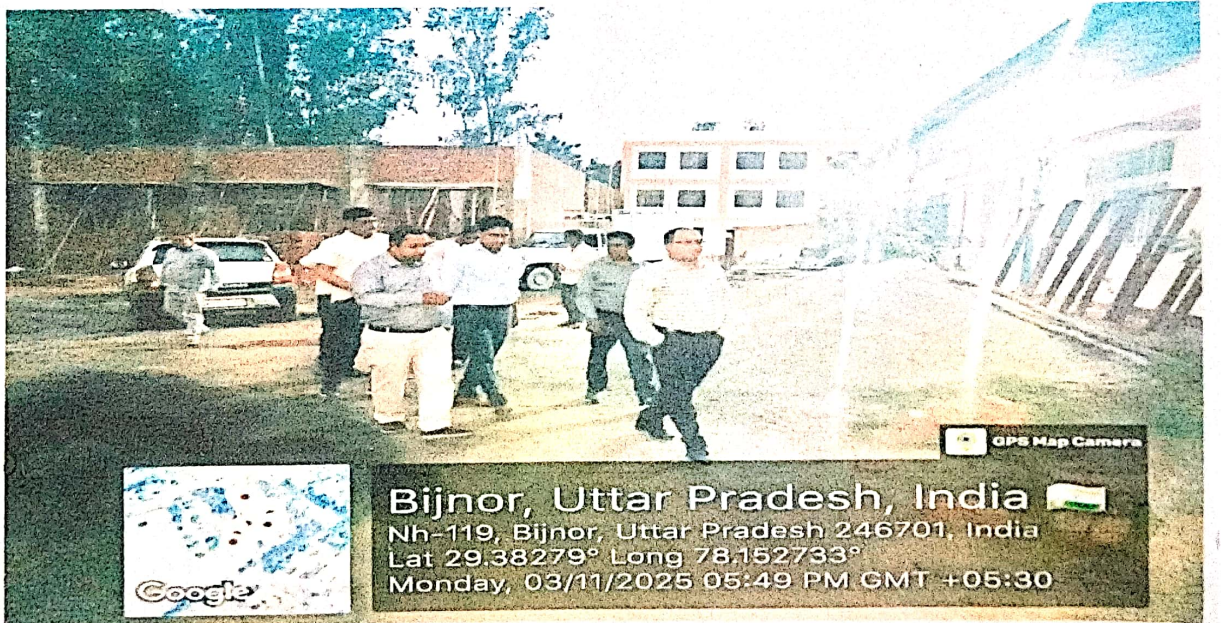


क्रमांक: ५८६/२०२५-२५

CONSTRUCTION OF 25 NOS CLASS ROOM AT GOVT. I.T.I. BIJNOR IN DIST-BIJNOR



वर्तमान में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष में वित्तीय प्रगति 100 प्रतिशत एवं भौतिक प्रगति लगभग 20 प्रतिशत है। कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।


अधिकासी अभियंता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
बिजनौर


अधिकासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
बिजनौर।
