

निरीक्षण आख्या

जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर के पत्रांक सं० 763/नि०का०/नोडल/2025-26 दिनांक 11.11.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 19.12.2025 को ग्राम चौरादेव ब्लॉक पुंवारका जनपद सहारनपुर में बाइट के अर्द्धनिर्मित भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता यू०पी०आर०एन०एस०एस० सहारनपुर उपस्थित रहे। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना शासनादेश सं० 1599/15-11-2014 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा स्वीकृत हुई थी। जिसकी मूल लागत धनराशि ₹० 411.71 लाख है। जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त ₹० 44.75 लाख दिनांक 31.03.2015, द्वितीय किस्त ₹० 42.26 लाख दिनांक 30.12.2017 कुल धनराशि ₹० 87.01 लाख निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुये थे। जिसके सापेक्ष ₹० 87.01 लाख का 100 प्रतिशत उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक सं० 107/यू०पी०आर०एन०एस०एस०/नि०प्र०स० दिनांक 19.05.2018 एवं पत्रांक सं० 521/यू०पी०आर०एन०एस०एस० निप्रस दिनांक 31.10.2019 के द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके उपरान्त धनराशि उपलब्ध न कराते हुये उपरोक्त परियोजना को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तदोपरान्त कार्ययोजना के तहत उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी, सहारनपुर के पत्रांक सं० डायट/2356/2023-24 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अर्द्धनिर्मित बाइट भवन के मानचित्र के अनुसार पूर्ण निर्माण का आगणन एवं मात्र मुख्य भवन का आगणन तैयार कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा के क्रम में पूर्ण निर्माण का आगणन एवं मात्र मुख्य भवन का आगणन तैयार कर प्रेषित किये गये थे। जिसके उपरान्त कार्ययोजना के तहत धनराशि ₹० 224.35 लाख दिनांक 28.12.2023 को संस्था को उपलब्ध कराये गये है। निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सं० राशै०/6087-91/2025-26 दिनांक 26.05.2025 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी गयी द्वितीय किस्त की धनराशि से प्रथमतः मुख्य भवन व चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके उपरान्त आगणन की धनराशि ₹० 411.71 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुये एवं टेन्डर कार्यवाही पूर्ण करते हुये कार्य को दिनांक 10.10.2025 को प्रारम्भ कराते हुये कार्य पूर्णता की तिथि 09.04.2027 निर्धारित की गयी है। इस प्रकार परियोजना पर वर्तमान समय तक ₹० 311.36 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी है। जिसके सापेक्ष धनराशि ₹० 151.19 लाख का व्यय निर्माण कार्य हेतु किया जा चुका है।

निरीक्षण के समय पाया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मुख्य भवन- 65 प्रतिशत छत स्तर पर, 20 प्रतिशत डोर बैड स्तर पर एवं 15 प्रतिशत सिल स्तर पर। बाउन्ड्रीवॉल- 95 प्रतिशत चिनाई कार्य पूर्ण, 40 प्रतिशत प्लास्टर कार्य प्रगति पर। बोरिंग कार्य पूर्ण है।



निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्माणाधीन मुख्य भवन के ऊपर से हाईटेन्शन लाईन निकल रही है। जिससे भविष्य में दुर्घटना घटने की सम्भावना प्रतीत होती है। मुख्य भवन में हाईटेन्शन लाईन हटने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा। निरीक्षण के समय कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्ट्या संतोषजनक पाई गयी। निरीक्षण आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

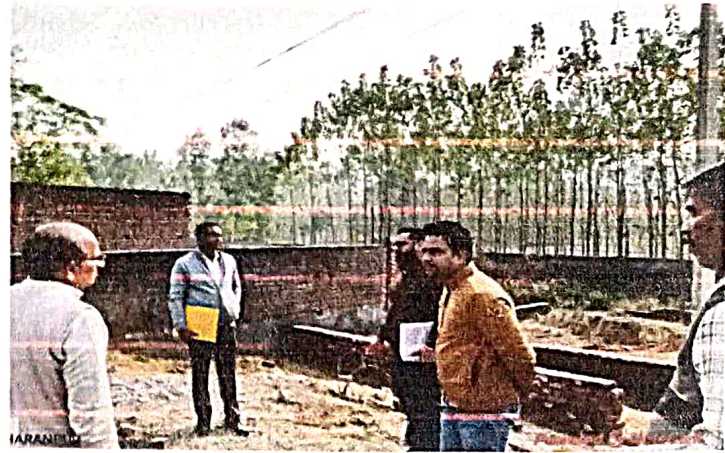
(Signature)

सहायक श्रमायुक्त
सहारनपुर।

निरीक्षण आख्या

जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर के पत्रांक सं० 763/नि०का०/नोडल/2025-26 दिनांक 11.11.2025 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 21.11.2025 को ग्राम चौरादेव ब्लॉक पुंवारका जनपद सहारनपुर में बाइट के अर्द्धनिर्मित भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता यू०पी०आर०एन०एस०एस० सहारनपुर उपस्थित रहे। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना शासनादेश सं० 1599/15-11-2014 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा स्वीकृत हुई थी। जिसकी मूल लागत धनराशि रू० 411.71 लाख है। जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त रू० 44.75 लाख दिनांक 31.03.2015, द्वितीय किस्त रू० 42.26 लाख दिनांक 30.12.2017 कुल धनराशि रू० 87.01 लाख निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुये थे। जिसके सापेक्ष रू० 87.01 लाख का 100 प्रतिशत उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक सं० 107/यू०पी०आर०एन०एस०एस०/नि०प्र०सा० दिनांक 19.05.2018 एवं पत्रांक सं० 521/यू०पी०आर०एन०एस०एस० निप्रस दिनांक 31.10.2019 के द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके उपरान्त धनराशि उपलब्ध न कराते हुये उपरोक्त परियोजना को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तदोपरान्त कार्ययोजना के तहत उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी, सहारनपुर के पत्रांक सं० डायट/2356/2023-24 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अर्द्धनिर्मित बाइट भवन के मानचित्र के अनुसार पूर्ण निर्माण का आगणन एवं मात्र मुख्य भवन का आगणन तैयार कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा के क्रम में पूर्ण निर्माण का आगणन एवं मात्र मुख्य भवन का आगणन तैयार कर प्रेषित किये गये थे। जिसके उपरान्त कार्ययोजना के तहत धनराशि रू० 224.35 लाख दिनांक 28.12.2023 को संस्था को उपलब्ध कराये गये है। निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सं० राशै०/6087-91/2025-26 दिनांक 26.05.2025 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी गयी द्वितीय किस्त की धनराशि से प्रथमतः एवं मुख्य भवन व चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके उपरान्त आगणन की रू० 411.71 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुये एवं टेन्डर कार्यवाही पूर्ण करते हुये कार्य को दिनांक 10.10.2025 को प्रारम्भ कराते हुये कार्य पूर्णता की तिथि 09.04.2027 निर्धारित की गयी है। इस प्रकार परियोजना पर वर्तमान समय तक रू० 311.36 लाख की धनराशि अवमुक्त हुयी है।

उक्त कार्य के निरीक्षण के समय पाया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मुख्य भवन- 80 प्रतिशत डोर बैण्ड स्तर पर, 20 प्रतिशत सिल स्तर पर। बाउन्ड्रीवॉल- 95 प्रतिशत चिनाई कार्य पूर्ण, 40 प्रतिशत प्लास्टर कार्य प्रगति पर। बोरिंग कार्य पूर्ण है।



निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्माणाधीन मुख्य भवन के ऊपर से हाईटेंशन लाईन निकल रही है। जिससे भविष्य में दुर्घटना घटने की सम्भावना प्रतीत होती है। मुख्य भवन में हाईटेंशन लाईन हटने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा। निरीक्षण के समय कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्टया संतोषजनक पाई गयी। निरीक्षण आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)

सहायक श्रमायुक्त
सहारनपुर।

प्रेषक:

अधिशारी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग(प्रान्तीय खण्ड)
सहारनपुर।

सेवा में,

उपशिक्षा निदेशक/प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
पटनी, सहारनपुर।

पत्रांक 3863/लो0नि0वि0-बाइट/2024-25

दिनांक 26/12/2024

विषय:- ब्लॉक पुंवारका के चौरादेव ग्राम में बाइट के अर्द्धनिर्मित भवन के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के अनुसार आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

मुख्य विकास अधिकारी जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 18.12.2024 को दिये गये निर्देशों एवं उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी सहारनपुर के पत्रांक रां0 डायट/बाइट/2906-09/2024-25 दिनांक 18.12.2024 के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियन्ता डी0आर0डी0ए0 सहारनपुर के साथ संयुक्त रूप से उक्त अर्द्धनिर्मित बाइट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उपस्थित रहे। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना शासनादेश रां0 1599/15-11-2014 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत रु0 412.67 लाख की थी। जिसके सापेक्ष धनराशि रु0 87.01 लाख कार्यदायी संस्था को प्राप्त हुये। उपरोक्त कार्य की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उ0प्र0 योजना भवन सं0 2670/दिनांक 05.11.2012 के तहत स्वीकृत है। जिसमें निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित थे-

1. मुख्य भवन
2. ब्यायज हॉस्टल
3. गर्ल्स हॉस्टल
4. कैन्टीन
5. ओ0एच0टी0
6. ट्यूबवेल/पम्प हाउस
7. बाउन्ड्रीवॉल

अ. वर्क डन:-

1. मुख्य भवन:- मुख्य भवन में ड्राइंग के अनुसार भूतल पर रिसोर्स रूम-02 नग, गर्ल्स क्लारा रूम-01 नग, क्लारा रूम-01 नग, लाइब्रेरी रूम-01 नग, एडमिन ऑफिस-01 नग, विजिटर रूम-01 नग, प्रिन्सिपल रूम टायलेट सहित-01 नग, स्टाफ रूम-01 नग, टायलेट ब्लॉक-02 नग, स्टेयर केस, लॉबी एवं बरामदा आदि के कार्य निरीक्षण के समय समस्त कार्य वर्क डन के अनुसार 50 प्रतिशत डोर बैण्ड स्तर तक एवं 50 प्रतिशत सिल स्तर तक पूर्ण पाये गये जोकि मानकों के अनुरूप एवं प्रथम दृष्टया सतोषजनक है। वर्तमान में स्टेयर केस की सिल स्तर तक दीवार के निकट पेंड उग आने के कारण

9

दीवार में दरार आ गई है तथा असमाजिक तत्वों द्वारा भी कुछ स्थानों पर दीवारों के ऊपरी हिस्से के रददे क्षतिग्रस्त कर दिये गये हैं। जिन्हे तोड़कर मानक एवं गुणवत्ता के साथ सही कराया जाना शेष है एवं आर0सी0सी0 के सरियों पर कई वर्षों से कार्य बन्द होने के कारण जंग लग गया है। जिन्हे काटकर तथा पूर्व निर्मित कॉलम को ओवरलेप स्तर तक तोड़कर पुनः मानको के अनुसार पूर्ण कराकर

• उक्त प्राविधान को कराते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा वर्क टू बी डन का कार्य किया जा सकता है।

2. ओ0एच0टी0:- ओ0एच0टी0 का कार्य प्रथम ब्रेसिंग स्तर तक पूर्ण है।

3. बाउन्ड्रीवॉल:- बाउन्ड्रीवॉल 80 प्रतिशत पूर्ण है।

उपरोक्त वर्क डन के कार्यों के ऊपर वर्क टू बी डन के कार्य कराये जा सकते हैं। परियोजना पर शासनादेश सं0 1599/15-11-2014 दिनांक 08.12.2014 के क्रम में परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 44.75 लाख दिनांक 31.03.2015 एवं द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 42.26 लाख दिनांक 30.12.2017 कुल धनराशि रू0 87.01 लाख कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 सहारनपुर को प्राप्त हुये हैं। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान समय तक धनराशि रू0 87.01 लाख का व्यय किया जा चुका है। जिसका उपभोग प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था के कार्यालय पत्रांक 107/यू0पी0आर0एन0एस0एस0 /निप्रस दिनांक 19.05.2018 एवं पत्रांक सं0 521/यू0 पी0आर0एन0एस0एस0/निप्रस दिनांक 31.10.2019 द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसके बाद से धनराशि अप्राप्त है एवं परियोजना का कार्य बन्द है। परियोजना की गुणवत्ता हेतु जनपदीय एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के द्वारा भी वर्क डन के कार्यों की जाँच समय-समय पर की गयी। उक्त जाँच रिपोर्ट में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है तथा भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो कि मानको के अनुरूप पाई गयी। (छायाप्रति संलग्न) पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से प्रश्नगत परियोजना का दिनांक 06.02.2024 को निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी जा चुकी है।

ब. वर्क टू बी डन:- स्वीकृति ड्राइंग के अनुसार भूतल पर मुख्य भवन के उपरोक्त रिसोर्स रूम-02 नग, गर्ल्स क्लास रूम-01 नग, क्लास रूम-01 नग, लाइब्रेरी रूम- 01 नग, एडमिन ऑफिस-01 नग, विजिटर रूम-01 नग, प्रिन्सिपल रूम टायलेट सहित-01 नग, स्टाफ रूम-01 नग, टायलेट ब्लॉक-02 नग, स्टेयर केस, लॉबी एवं बरामदा आदि के अवशेष कार्यों पर डोर बेण्ड के ऊपर के एवं सिल स्तर के ऊपर के कार्य कराये जाने शेष है। जिसमें कार्ययोजना के तहत प्राप्त धनराशि रू0 224.35 लाख में वर्क टू बी डन में मात्र मुख्य भवन के भूतल व ममटी का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि यदि भविष्य में उपरोक्त शेष प्रस्तावित कार्य कराये जाने की स्थिति में तत्कालीन वर्तमान डी0एस0आर0 दरों पर गठित आगणन के अनुसार धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में परियोजना के समस्त कार्य पूर्ण कराये जायेगे।

उपरोक्त परियोजना के मुख्य भवन के भूतल की सत्यापन आख्या वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर तैयार कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
सहारनपुर।

अधिसाक्षी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड)
सहारनपुर।

प्रभारी अधिकारी प्रयोगशाला,
निर्माण खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि०,
सहारनपुर।

पत्रांक: 1418/1-प्रयोगशाला

दिनांक: 09-10-17

सेवा में,

प्राविधिक परीक्षक/अधिकासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
सहारनपुर।

विषय: परीक्षण परिणाम,

संदर्भ: आपके पत्रांक:995/ग्रा० अ० वि० /एस० टी० /सेम्पल परीक्षण/2017-18

दिनांक: 26.09.2017

उपरोक्त संदर्भ में आप द्वारा भेजे गये नमूने के परीक्षण परिणाम निम्नानुसार है।

केन्द्रीय योजना ब्लाक इन्स्टीट्यूट आफ टीचर एजुकेशन विकास खण्ड पुवारका
सहारनपुर।

S. No.	Type of Sample & Mark	Area of Bricks in cm^2	Maximum Load at Failure in Kg.	Compressive Strength in Kg/cm^2
1	ईट BS09	$22.0 \times 10.8 = 237.60$	$400 \times 100 = 40000$	168.35
2	ईट BS48	$22.2 \times 10.7 = 237.54$	$360 \times 100 = 36000$	151.55
3	ईट BS76	$22.5 \times 10.8 = 243.00$	$375 \times 100 = 37500$	154.32

नोट: परीक्षण आप द्वारा भेजे गये नमूने का किया गया है।

आपके पत्र के अनुसार परियोजना अभियन्ता, यू०पी०आर०एन०एस०एस० प्रखण्ड सहारनपुर द्वारा

कार्यालय अधिकासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि०, सहारनपुर में जमा की गयी धनराशि

(परीक्षण शुल्क) रुपये 1302/- का रसीद नं० 095601 दिनांक 03.10.17 है।

प्रभारी अधिकारी प्रयोगशाला,
निर्माण खण्ड (प्र०प०)
लो०नि०वि०, सहारनपुर।

पत्रांक: 3387/12सी

दिनांक : 08/11/2024

सेवा में,


अधिशायी अभियन्ता,
यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड,
सहारनपुर

विषय: ब्लाक पुवारंका जनपद सहारनपुर के ग्राम चौरादेव में बाइट के अर्द्धनिर्मित भवन के
आगणन को वेट कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक 452/यू0पी0आर0एन0एस0एस0/निप्रस/ 2024-25 दिनांक
08-11-2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, आपके द्वारा
प्रेषित ब्लाक पुवारंका जनपद सहारनपुर के ग्राम चौरादेव में बाइट के अर्द्धनिर्मित भवन के
आगणन में लगायी गयी दरों की दिल्ली शेडयूल ऑफ रेट्स से जांच कर आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सहारनपुर

निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम: ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग चौरादेव ब्लॉक- पुर्वोरका, जनपद- सहारनपुर का निर्माण कार्य।

उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी, सहारनपुर के पत्रांक डायट/2755-61/2023-24 दिनांक 03.02.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 02.02.2024 को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर के द्वारा ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग चौरादेव ब्लॉक- पुर्वोरका, जनपद- सहारनपुर के स्थलीय सत्यापन हेतु 03 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर द्वारा गठित समिति द्वारा आज दिनांक 06.02.2024 को उपरोक्त कार्य स्थल की मौके पर जाँच की गयी। जाँच के समय कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता श्री संदीप कुमार इन्दौरिया एवं अवर अभियन्ता श्री वरुण सक्सेना उपस्थित रहे।

कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना शासनादेश संख्या 1599/15-11-2014 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत 412.67 थी। कार्यदायी संस्था को परियोजना के सापेक्ष प्रथम किस्त रु0 44.75 लाख दिनांक 31.03.2015 एवं द्वितीय किस्त रु0 42.26 लाख दिनांक 30.12.2017, कुल धनराशि रु0 87.01 लाख प्राप्त हुए, शेष धनराशि वर्तमान तक अप्राप्त है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक रु0 87.01 लाख व्यय किये जा चुके हैं। जिसका उपभोग प्रमाण पत्र प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी, सहारनपुर को कार्यदायी संस्था के कार्यालय पत्रांक 107/यू0पी0आर0एन0एस0एस0/नि0प्र0स0 दिनांक 19.05.2018 को प्रेषित किया जा चुका था। पुनः दिनांक 31.10.2019 को उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के पत्रांक 838/डायट/2020-21 दिनांक 19.09.2020 के द्वारा प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को भी किस्त अवमुक्त कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु अभी तक अवशेष धनराशि अप्राप्त है।

निरीक्षण के समय मुख्य भवन के भूतल का कार्य 50% डोर बैण्ड स्तर एवं 50% सिल स्तर तक पूर्ण पाया गया एवं बाउण्ड्रीवाल कार्य 80% पूर्ण पाया गया तथा ओ0एच0टी0 का कार्य प्रथम ब्रेसिंग स्तर तक पूर्ण पाया गया। कैंटीन ब्लॉक एवं छात्रावासों का कार्य अनारम्भ पाया गया। मौके पर कार्य बंद पाया गया, कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण कार्य विगत कई वर्षों से बंद है। स्थलीय निरीक्षण के समय प्राप्त अभिलेखों के अनुसार परियोजना की गुणवत्ता हेतु जनपदीय एवं मण्डलीय टास्कफोर्स टीम द्वारा भी उक्त की जाँच समय-समय पर की गई है जाँच रिपोर्ट में परियोजना की गुणवत्ता संतोषजनक है तथा भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो कि मानकों के अनुरूप पायी गयी। निरीक्षण के दौरान कृत कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्टया संतोषजनक पायी गयी। कार्य प्राक्कलन एवं ड्राईंग के अनुसार संतोषजनक पाया गया। मौके पर भवन के ऊपर से एच0टी0 लाईन जा रही है, जिसको हटाया जाना आवश्यक है।

21/02/2024
उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
पटनी, सहारनपुर।

उप जिलाधिकारी
सहारनपुर।

06/02/24
अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि(प्रा0ख0)
सहारनपुर।

कार्य का नाम:-


ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन चौरा देव ब्लॉक पुंवारका जनपद सहारनपुर का निर्माण कार्य।


-: जाँच-आख्या :-

जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के पत्रांक: 256/स्था0सात्यापन/2020-21/दिनांक 17.09.2020 के द्वारा "ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन चौरा देव ब्लॉक पुंवारका जनपद सहारनपुर" के कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु दो सदस्य समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा आज दिनांक 23.09.2020 को उपरोक्त कार्यस्थल की मौके पर जांच की गयी। जांच के समय कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता श्री रोहित कुमार गौतम उपस्थित रहें।

कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के पत्रांक: 1599/15-11/2014/दिनांक 08.12.2014 द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत ₹0 412.67 लाख है। कार्यदायी संस्था को परियोजना हेतु वर्तमान तक ₹0 412.67 लाख के सापेक्ष ₹0 87.01 लाख प्राप्त हैं, शेष धनराशि अप्राप्त है। उक्त कार्य हेतु प्राप्त धनराशि का 100 प्रतिशत उपभोग कर, उपभोग प्रमाण पत्र प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी सहारनपुर को कार्यदायी संस्था के कार्यालय के पत्रांक: 107/यू0पी0आर0एन0एस0एस0/नि0प्र0स0/दिनांक 19.05.2018 को प्रेषित किया जा चुका है एवं पुनः दिनांक 31.10.2019 को उपभोग प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है। किन्तु अभी तक धन अप्राप्त है।

निरीक्षण के समय मुख्य भवन (Institution Building) का कार्य 50 प्रतिशत डोर वैंड स्तर तक एवं 50 प्रतिशत सिल स्तर तक पूर्ण पाया गया, वाउण्ड्री का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण पाया गया तथा ओ0एच0टी0 का कार्य प्रथम ट्रेसिंग तक पूर्ण पाया गया। कैंटीन ब्लॉक, छात्रावास का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। उक्त स्थल पर झाड़-झंकार पाये गये तथा कार्य वन्द पाया गया, इस भवन के निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर की प्रयोगशाला से सामग्री की जांच करायी गयी। उक्त संस्था से सन्तुष्ट जांच के दस्तावेज मांगें जाने पर प्रस्तुत किये गये। निरीक्षण के दौरान कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक पायी गयी। कार्य प्राक्कलन एवं ड्राइंग के अनुसार सन्तोषजनक पाया गया। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि प्राप्त होते ही कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अब तक कराया गया उक्त कार्य प्रथम दृष्टया सन्तोषजनक पाया गया।


जिला पंचायत राज अधिकारी,
सहारनपुर।


अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

निरीक्षण आख्या

जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर के द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 606/स्थ0 सत्यापन/2019-20 दिनांक 20.11.2019 के द्वारा रु0 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में वाईट चौरादेव, विकास खण्ड-पुर्वोरकाका स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन दिनांक 04.01.2019 को अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-3 लोक निर्माण विभाग सहारनपुर, जिला कृषि अधिकारी सहारनपुर एवं कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता श्री संदीप कुमार इंदौरिया एवं सहायक अभियन्ता श्री रोहित कुमार गौतम द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर शासन के पत्रांक 1599/15-11-2014 दिनांक 08.12.2014 द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत रु0. 412.67 लाख है। अधिशासी अभियन्ता यू0पी0आर0एन0एस0एस0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को परियोजना हेतु वर्तमान तक रु0 412.67 लाख के सापेक्ष रु0 87.01 लाख प्राप्त है, शेष धनराशि अप्राप्त है। उक्त कार्य हेतु प्राप्त धनराशि का 100 प्रतिशत उपभोग कर उपभोग प्रमाण पत्र प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटनी सहारनपुर को कार्यदायी संस्था के कार्यालय पत्रांक 107/यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निप्रस दिनांक 19.05.2018 को प्रेषित किया जा चुका है एवं पुनः दिनांक 31.10.2019 को उपभोग प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है किन्तु अभी तक धनराशि अप्राप्त है। निरीक्षण के समय मुख्य भवन(इन्स्टीट्यूशन बिल्डिंग) में का कार्य 50% डोर वैण्ड तक एवं 50% सिल स्तर तक पूर्ण पाया गया, बाउण्ड्रीवाल का कार्य 80% पूर्ण पाया गया एवं बोरिंग का कार्य पूर्ण पाया गया तथा ओ0एच0टी0 का कार्य प्रथम ब्रेसिंग तक पूर्ण पाया गया। कैटीन ब्लॉक, छात्रावासों का कार्य अनारम्भ पाया गया। मौके पर धनाभाव के कारण कार्य बंद पाया गया। भवन कार्य में प्रयुक्त सामग्री/अव्यव की गुणवत्ता प्रमाणक नहीं है। कार्य प्राक्कलन एवं ड्राईंग के अनुसार संतोषजनक पाया गया। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। अतः अग्रिम किस्त की मांग की संस्तुति की जाती है, ताकि अवशेष निर्माण कार्य तुरन्त चालू हो सके।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0
सहारनपुर।

जिला कृषि अधिकारी
सहारनपुर।

जॉच आख्या


आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पृष्ठांकन 68/ दिनांक 23.08.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में परियोजना प्रबंधक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 (पूर्व में पैक्सफैड), निर्माण प्रखंड, सहारनपुर द्वारा ग्राम चौरादेव निकट गागलहेडी, जिला सहारनपुर में निर्माणाधीन बाईट भवन की जॉच का कार्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को सौंपा गया। मौके पर जॉच हेतु दिनांक 22/23-09-2017 निर्धारित की गयी परन्तु मौके पर दिनांक 25-09-2017 को कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता एवं अवर अभियन्ता के साथ जॉच की गयी। जॉच आख्या निम्नवत है।

1-ग्राम चौरादेव निकट गागलहेडी जिला सहारनपुर में निर्माणाधीन बाईट भवन:-

शिक्षक शिक्षा योजनान्तर्गत रु0 412.67 लाख उ0प्र0शाराण, लखनऊ से स्वीकृत हुये हैं जिसके विरुद्ध 44.75 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। कार्य पर अद्यतन व्यय रु0 42.79 लाख किए जा चुके हैं। प्राक्कलन में मुख्यतः निम्न प्राविधान लिये गये हैं:-

- 1- इन्स्टीट्यूशन बिल्डिंग 1494.56 वर्गमी0
- 2- छात्रावास ड्राइंग अनुसार 27 छात्रों हेतु भूतल 343.97 वर्गमी0 एवं प्रथम तल 298.72 वर्गमी0
- 3- कैंटीन ब्लाक 131.00 वर्गमी0
- 4- रावगर्शिवल पम्प, बोरिंग, आर0सी0सी0 ओवर हैड टैंक 1.0 नं0
- 5- स्टार्म वाटर ड्रेन 282.00 रनिंग मीटर
- 6- बाउण्ड्रीवाल 275.00 रनिंग मीटर
- 7- गेट 1.0 नं0

मौके पर बाउण्ड्रीवाल में चिनाई का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है परन्तु प्लास्टर का कार्य शेष है एवं पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर तक एवं ओ0एच0टी का निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर पूर्ण हो चुका है। मुख्य भवन की गात्र नींव खोदी गयी है जो कि लम्बे समय से कार्य बन्द होने के कारण नींव में गिट्टी भर गयी है। अतः नींव में से पुनः गिट्टी हटवाने के निर्देश मौके पर अवर अभियंता को दिये गये। निर्माण कार्य पर अब तक सामग्री पर रु0 34.00 लाख एवं लेबर पर लगभग 8.75 लाख व्यय दर्शाया गया है। निरीक्षण के समय निर्माण कार्य बंद था मौके पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निर्माण कार्य लम्बे समय से बंद पड़ा है। निर्माण स्थल पर कार्य बंद होने के कारण सामग्री जैसे ईटें, बालू एवं सारिया अव्यस्थित रूप से पड़ा हुआ है जिसे स्टोर में रखने के निर्देश अवर अभियंता को दिये गये। उपलब्ध ईटों में से तीन ईटों का सैम्पल लिया गया जो सहायक अभियंता (प्रयोगशाला), प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर को शिल्ड कर भेजा गया जिसकी सैम्पल आख्या दिनांक 09-10-2017 को प्राप्त हुयी है जो मानकों के अनुरूप है साथ में संलग्न-1 है। मौके पर जो चिनाई एवं प्लास्टर का कार्य किया गया है उसमें से प्लास्टर सामान्यतः ठीक प्रतीत हो रहा है एवं चिनाई कार्य में वर्कमैनशीप का अभाव मिला जिसे ठीक कराने के निर्देश मौके पर सहायक अभियंता को दिये गये। कार्यदायी संस्था ने अवगत कराया कि शेष घनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य को आरम्भ कर दिया जायेगा। अतः दूसरी किश्त की मांग की संस्तुति की जाती है ताकि अवशेष निर्माण कार्य तुरन्त चालू हो सकें।


(मौ0 इरफान)
प्राविधिक परीक्षक
