

क्रमांक : मिहिरा के दो मंजिला छात्रावास नमून /
नाम : न्यायीत्व का सपना 104 भाग निर्माता

1000 811 86124

21/2/25


तकनीकी जॉच आख्या

कार्य का नाम :	जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय फतेहपुर-84 में छात्रावास एकेडमिक ब्लॉक (कक्षा-9 से 12 तक) का निर्माण कार्य
शानादेशसंख्या :	241/68-5-2020 दिनांक : 17.03.2020
कार्य की स्वीकृत लागत :	₹ 313.32 लाख
अवमुक्त धनराशि :	₹ 301.76 लाख

दिनांक 29.11.2024 को जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय फतेहपुर-84 में छात्रावास एकेडमिक ब्लॉक (कक्षा-9 से 12 तक) का स्थलीय निरीक्षण मुख्य सचिव महोदय उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 178/2023/आई 411903/901-23-5-2023-27(सा)/2022 लोडिओनुमांग-5 दिनांक 20.10.2023 के अनुपाल में मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद उन्नाव के पत्रांक संख्या: 810/सी.एम.आई.एस./2024 दिनांक 21.11.2023 के क्रम में निर्माण कार्य का तकनीकी/भौतिक सत्यापन किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यस्थल पर उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव।
2. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग (संयोजक), उन्नाव।
3. वैसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
4. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उन्नाव।
5. अधिशाही अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन उन्नाव।
6. अनाविल सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ-III
7. महेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ-III



प्राविधानित कार्य -

छात्रावास (मूल)

रूम : 05 नग (साइज 3.37X6.30 मी० प्रति नग), रूम : 08 नग (साइज 6.30X3.37 मी० प्रति नग), वेडरूम : 01 नग (साइज 4.40X3.40 मी०), वार्डन आफिस - 01 नग (साइज 3.40X3.45 मी०), मेडिकल चेक - 01 नग (साइज 3.60X5.50 मी०), रिसीशन - 1 नग (साइज 3.60X5.50 मी०), डायनिंग - 1 नग (साइज 5.56X6.60 मी०), फेनट्री - 1 नग (साइज 2.30X1.87 मी०), किचन - 1 नग (साइज 3.20X3.10 मी०), स्टोर - 1 नग (साइज 1.67X2.03 मी०)।

छात्रावास (प्रथम तल)

रूम : 05 नग (साइज 3.37X6.30 मी० प्रति नग), रूम : 08 नग (साइज 6.30X3.37 मी० प्रति नग), टायलेट - 02 नग (साइज 3.83X4.89 मी० प्रति नग)

निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि शासनादेश एवं इस कार्य हेतु गठित आंगणन के अनुसार फायर सेफ्टी, विद्युत संयोजन/सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य समस्त मानकों के अनुरूप कार्य करा दिये जायें।

क्रमांक 101/2024/अ.प्र.वि.वि.

नाम

अध्यक्ष

01/01/24

21/12/25

एकेडमिक ब्लॉक

क्लास रूम : 04 नग (साइज 8.00X6.00 मी0 प्रति नग), बायोलीजी लैब - 01 नग (साइज 9.00X6.00 मी0), फिलिक्स लैब : 01 नग (साइज 9.00X6.00 मी0), स्टाफ रूम -01 नग (साइज 3.59X6.00 मी0),गैस रूम 01 नग (साइज 3.59X6.00 मी0), एन0सी0सी0 रूम : 01 नग (साइज 3.59X6.00 मी0), कैमिस्ट्री लैब - 01 नग (साइज 9.00X6.00 मी0)।

कार्य की भौतिक प्रगति-कार्यस्थल पर उपस्थित यू0पी0आर0एन0एस0के अधिकारियों द्वारा जाँच समिति को स्वीकृत प्राक्कलन एवं ड्राईंग प्रस्तुत की गयी है। जाँच समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

छात्रावास

1. रूम- निरीक्षण के दौरान रूम की लम्बाई एवं चौड़ाई मापी गयी जोकि मानक के अनुरूप पायी गयी है, एवं रूम में 04 अलमारी का भी निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया।
2. कॉरिडोर- निरीक्षण के दौरान कॉरिडोर की लम्बाई एवं चौड़ाई मापी जोकि मानक के अनुरूप पायी गयी है।
3. शौचालय- शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान शौचालयों में सैनेटरी फिटिंग पूर्ण पायी गयी।

एकेडमिक ब्लॉक

1. कॉरिडोर- निरीक्षण के दौरान कॉरिडोर की लम्बाई एवं चौड़ाई मापी जोकि मानक के अनुरूप पायी गयी है।
2. क्लॉस रूम- निरीक्षण के दौरान क्लॉस रूम की लम्बाई एवं चौड़ाई मापी जोकि मानक के अनुरूप पायी गयी है, एवं रूम में 04 अलमारी का भी निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया।
3. शौचालय- शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान शौचालयों में सैनेटरी फिटिंग पूर्ण पायी गयी।

कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय फतेहपुर-84 में छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक (कक्षा-9 से 12 तक) का निर्माण कार्य आगमन के अनुसार पूर्ण पाया गया। प्रथम दृष्टया कराये गये कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक है, भवन को हस्तांतरित करते हुए उपयोग में लाया जा सकता है।

भेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

अधिकांसी अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लोक
निर्माण विभाग
(संयोजक), उन्नाव।

अधिकांसी अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन
उन्नाव।

अधिकांसी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उन्नाव।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव

पत्रांक 2374/वै0सहायक/2024-25 दिनांक 03/02 2025
प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
2. भेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
3. अधिकांसी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड उन्नाव।
4. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-बांगरमऊ।
5. अधिकांसी अभियन्ता, सिंचाई विभाग-उन्नाव।
6. अधिकांसी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण संहकरी संघ लि0, लखनऊ-III।

मुख्य विकास अधिकारी,
उन्नाव।

सत्यापन आख्या

कार्य का नाम

जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फतेहपुर चौरासी में निर्माणशील छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण कार्य।

शासनादेश सं०

241/68-5-2022, दिनांक : 17.03.2020

मूल स्वीकृत लागत

रु० 315.77 लाख

तकनीकी स्वीकृति लागत

रु० 313.32 लाख

कुल प्राप्त धनराशि

रु० 202.93 लाख

कुल व्यय धनराशि

रु० 185.98 लाख

मुख्य अभियन्ता महोदय उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक - 280/क्यू०एफ०/सिविल/टी० दिनांक : 07.03.2019 के अनुपालन में प्रखण्ड कार्यालय में लखनऊ तृतीय के निर्माणशील जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फतेहपुर चौरासी में निर्माणशील छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण कार्य का सत्यापन दिनांक : 02.05.2024 को श्री अनादिल सिंह, सहायक अभियन्ता एवं श्री महेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता यू०पी०आर०एन०एस० प्रखण्ड लखनऊ तृतीय की उपस्थिति में किया गया। सत्यापन आख्या निम्नवत् है:-


कार्य का स्तर :-

छात्रावास-

1. छात्रावास का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण।
2. ब्रिककोबा का कार्य पूर्ण।
3. प्लास्टर कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण।
4. फर्श कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण।
5. पेंटिंग कार्य, अवशेष फर्श कार्य, प्लास्टर कार्य एवं फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।

एकेडमिक ब्लॉक-

1. एकेडमिक ब्लॉक का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण।
2. ब्रिककोबा का कार्य पूर्ण।
3. प्लास्टर कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण।
4. कोटा स्टोन लगाने का कार्य लगभग पूर्ण, बिट्टीफाइड टाइल लगाने का कार्य प्रगति पर।
5. अवशेष फर्श कार्य, प्लास्टर कार्य एवं फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।

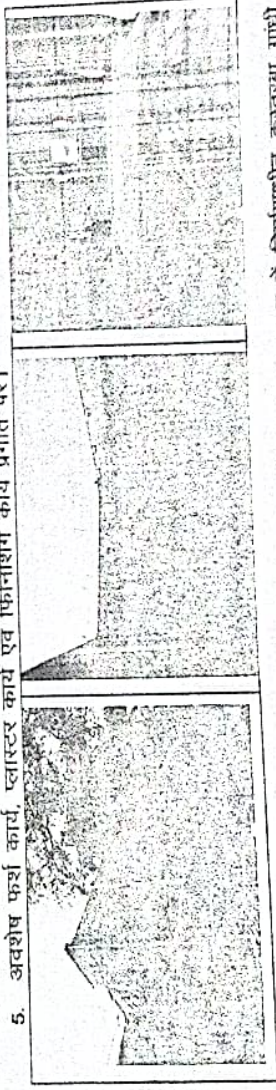

निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक है। जनपद उन्नाव में निर्माणशील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फतेहपुर चौरासी में छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक कार्य की कुल लागत रु० 313.32 लाख है। उक्त निर्माण कार्य प्रखण्ड की प्राप्त धनराशि रु० 202.93 लाख के सापेक्ष (लेखा के आधार पर) रु० 185.98 लाख का व्यय किया जा चुका है।

अधिसाक्षी अभियन्ता

यू०पी०आर०एन०एस०

निर्माण प्रखण्ड अनुसूचण प्रखण्ड

2

तकनीकी जॉच आख्या

कार्य का नाम	:	जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय फतेहपुर चौरासी में एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास का निर्माण कार्य (कक्षा - 9 से 12 तक)
शासनादेश संख्या	:	241 / 68-5-2020 दिनांक : 17.03.2020
कार्य की स्वीकृत लागत	:	रु0 313.32 लाख
अवमुक्त धनराशि	:	रु0 126.31 लाख (प्रथम किस्त)
	:	रु0 76.61 लाख (द्वितीय किस्त)
	:	कुल रु0 202.92 लाख

दिनांक : 23.02.2024 को जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय फतेहपुर चौरासी में एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास के निर्माण कार्य (कक्षा - 9 से 12 तक) का स्थलीय निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या : के0जी0बी0वि0 / उच्चीकरण/ जॉच / 30870-76 / 2022-23 दिनांक - 24.03.2023 के क्रम में किया गया। निर्माण कार्य के भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन करते समय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ निर्माण प्रखण्ड लखनऊ तृतीय के सहायक अभियन्ता श्री अनाविल सिंह एवं अवर अभियन्ता श्री महेन्द्र कुमार व सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रहे।



अ

8

प्राविधानित कार्य -

छात्रावास (भूतल)

रूम : 05 नग (साइज 3.37X6.30 मी0 प्रति नग), रूम : 08 नग (साइज 6.30X3.37 मी0 प्रति नग), वेडरूम : 01 नग (साइज 4.40X3.00 मी0), गार्डन आफिस - 01 नग (साइज 3.40X3.45 मी0), मेडिकल चेक - 01 नग (साइज 3.60X5.50 मी0), रिसेशन - 1 नग (साइज 3.60X5.50 मी0), डायनिंग - 1 नग (साइज 5.56X6.60 मी0), पैन्ट्री - 1 नग (साइज 2.30X1.87 मी0), किचन - 1 नग (साइज 3.20X3.10 मी0), स्टोर - 1 नग (साइज 1.67X2.03 मी0)।

छात्रावास (प्रथम तल)

रूम : 05 नग (साइज 3.37X6.30 मी0 प्रति नग), रूम : 08 नग (साइज 6.30X3.37 मी0 प्रति नग), टायलेट - 02 नग (साइज 3.83X4.89 मी0 प्रति नग)।

एकेडमिक ब्लॉक

क्लास रूम : 04 नग (साइज 8.00X6.00 मी0 प्रति नग), बायोलॉजी लैब - 01 नग (साइज 9.00X6.00 मी0), फिजिक्स लैब : 01 नग (साइज 9.00X6.00 मी0), स्टाफ रूम -01 नग (साइज 3.59X6.00 मी0), गेम्स रूम 01 नग (साइज 3.59X6.00 मी0), एन0सी0सी0 रूम : 01 नग (साइज 3.59X6.00 मी0), कॅमिस्ट्री लैब - 01 नग (साइज 9.00X6.00 मी0)।

कार्य का स्तर - (छात्रावास एवं एकेडमिक ब्लॉक)

1. छात्रावास के भूतल का स्लैब कार्य एवं अन्दर के प्लास्टर का 100 प्रतिशत कार्य तथा सामने का प्लास्टर कार्य पूर्ण पाया गया।
2. छात्रावास के प्रथम तल के स्लैब कार्य पूर्ण एवं अन्दर के प्लास्टर का कार्य पूर्ण।
3. भूतल के कमरों की फर्श की पी0सी0सी0 का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है।
4. रूफ में ब्रिक कोवा कार्य पूर्ण।
5. एकेडमिक ब्लॉक का स्लैब कार्य पूर्ण एवं अन्दर का प्लास्टर कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर।
6. भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार कराया जा रहा है।


भवन में कराये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक पायी गयी। कराये गये कार्यों की सामग्री की जाँच लोक निर्माण विभाग, उन्नाव एवं राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से करायी गयी है, जिसके परीक्षण परिणाम संतोषजनक है (रिपोर्ट संलग्न) कार्य स्थल पर उपस्थित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु




नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे एवं ठेकेदार को निर्देशित करें की कार्य गति तेज कर समय से पूर्ण करवायें। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कराये गये कार्यों पर द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि का उपभोग लगभग कर लिया गया है एवं तृतीय किस्त की धनराशि अभी तक अप्राप्त है।


खण्ड शिक्षा अधिकारी,
फतेहपुर चौरासी, उन्नाव


अधिराषी अभियन्ता,
जल निगम ग्रामीण, उन्नाव


नगर मजिस्ट्रेट,
उन्नाव
