


तकनीकी जाँच आख्या

कार्य का नाम :	जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालय सफीपुर में छात्रावास (कक्षा-9 से 12 तक) का निर्माण कार्य
शानादेशसंख्या :	241/68-5-2020 दिनांक : 17.03.2020
कार्य की स्वीकृत लागत :	रु0 177.16 लाख
अवमुक्त धनराशि :	रु0 170.60 लाख

दिनांक 25.10.2024 को जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालय सफीपुर में छात्रावास (कक्षा-9 से 12 तक) का स्थलीय निरीक्षण मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 178/2023/आई 411903/901-23-5-2023-27(सा)/2022 लो0नि0अनुभाग-5 दिनांक 20.10.2023 के अनुपालन में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद उन्नाव के पत्रांक संख्या: स0शि0/के0जी0वी0वी0/20274-82/2024-25 दिनांक: 23.10.2024 के क्रम में निर्माण कार्य का तकनीकी/भौतिक सत्यापन किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यस्थल पर उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, उन्नाव।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग (संयोजक), उन्नाव।
3. बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
4. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उन्नाव।
5. अवर अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन उन्नाव।
6. अनाविल सिंह, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-III
7. महेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-III

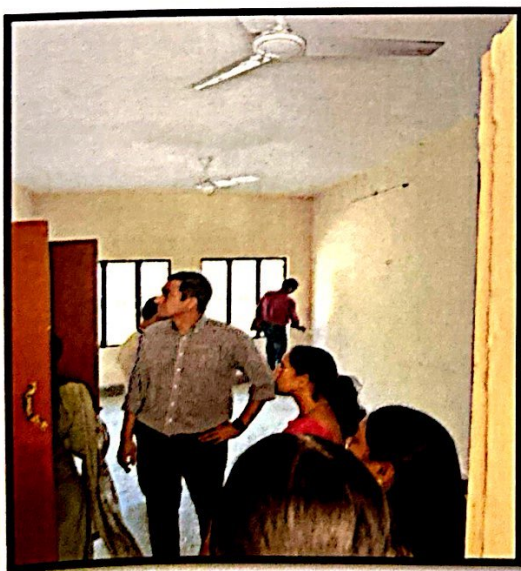

प्राविधानित कार्य -

छात्रावास (भूतल)

रूम : 05 नग (साइज 3.37X6.30 मी0 प्रति नग), रूम : 08 नग (साइज 6.30X3.37 मी0 प्रति नग), बेडरूम : 01 नग (साइज 4.40X3.00 मी0), वार्डन आफिस - 01 नग (साइज 3.40X3.45 मी0), मेडिकल चेक - 01 नग (साइज 3.60X5.50 मी0), रिसेप्शन - 1 नग (साइज 3.60X5.50 मी0), डायनिंग - 1 नग (साइज 5.56X6.60 मी0), पैनट्री - 1 नग (साइज 2.30X1.87 मी0), किचन - 1 नग (साइज 3.20X3.10 मी0), स्टोर - 1 नग (साइज 1.67X2.03 मी0)।

छात्रावास (प्रथम तल)

रूम : 05 नग (साइज 3.37X6.30 मी0 प्रति नग), रूम : 08 नग (साइज 6.30X3.37 मी0 प्रति नग), टायलेट - 02 नग (साइज 3.83X4.89 मी0 प्रति नग)

कार्य की भौतिक प्रगति:-कार्यस्थल पर उपस्थित यू0पी0आर0एन0एस0एस0 के अधिकारियों द्वारा जाँच समिति को स्वीकृत प्राक्कलन एवं ड्राईंग प्रस्तुत की गयी है। जाँच समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1. **रूम:-** निरीक्षण के दौरान रूम की लम्बाई एवं चौड़ाई मापी गयी जोकि मानक के अनुरूप पायी गयी है, एवं रूम में 04 अलमारी का भी निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया।
2. **कॉरिडोर:-** निरीक्षण के दौरान रूम की लम्बाई एवं चौड़ाई मापी जोकि मानक के अनुरूप पायी गयी है।
3. **शौचालय:-** शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान शौचालयों में सैनेटरी फिटिंग पूर्ण पायी गयी।

कस्तूरबा गंधी बालिका विद्यालय सफीपुर में छात्रावास (कक्षा-9 से 12 तक) के निर्माण कार्य आगणन के अनुसार पूर्ण पाया गया। प्रथम दृष्टया कराये गये कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक है, भवन को हस्तांतरित करते हुए उपयोग में लाया जा सकता है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक
निर्माण विभाग
(संयोजक), उन्नाव।

अधिकासी अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर
कारपोरेशन उन्नाव।

अधिकासी अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उन्नाव।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव

पत्रांक 1904 / वै0सहायक / 2024-25 दिनांक 26-11-2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ।
2. बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव।
3. अधिकासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड उन्नाव।
4. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-मुस्वा।
5. अधिकासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग-उन्नाव।
6. अधिकासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-III

मुख्य विकास अधिकारी,
उन्नाव।
