

निरीक्षण आख्या

- 1- कार्य का नाम- जनपद कुशीनगर लार्ड बुद्धा पार्क रवीन्द्रनगर धूस में सुदृढीकरण का कार्य।
- 2- डी0पी0आर0 के अनुसार कार्य का विवरण- जिम हाल ,टायलेट ब्लॉक,गोडाउन कम ऑफिस ,पम्प हाउस,नाली, इण्टर लॉकिंग ,पाथवे,मिट्टी भराई,प्लान्टेशन, रोलर स्ट्रीट लाईट,वाडण्डीवाल का जीर्णोद्धार।
- 3-विभाग- उद्यान विभाग
- 4-कार्यदायी संस्था- यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड गोरखपुर द्वितीय
- 5- स्वीकृत धनराशि (रु0 करोड़)-4.9969
- 6- अवमुक्त धनराशि-3.2622
- 7- कार्य आरम्भ की तिथि-16.03.2024 (अनुबन्ध के अनुसार)/15.06.2024 (वास्तविक)

निरीक्षण:-

1- वर्तमान में भौतिक प्रगति:-

(क)पूर्ण किये गये कार्य का विवरण :-
(फोटोग्राफ सहित)- जिम हाल

टायलेट ब्लॉक 1

टायलेट ब्लॉक 2

गोडाउन कम ऑफिस
पम्प रुम

- छत,ब्रिक कोवा एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण। आन्तरिक विद्युतीकरण,आन्तरिक वॉटर सप्लाई ,फर्श एवं पुट्टी कार्य प्रगति पर।
- छत एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण। आन्तरिक वॉटर सप्लाई एवं फर्श कार्य प्रगति पर।
- छत कार्य पूर्ण। आन्तरिक वॉटर सप्लाई कार्य प्रगति पर।
- छत एवं ब्रिक कोवा कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य प्रगति पर।
- छत स्तर तक कार्य पूर्ण।
- मिट्टी भराई का कार्य प्रगति पर।

(ख) प्रतिशत (भौतिक प्रगति का):-45% (लगभग)


2- उपभोग की गयी धनराशि :-195.05 लाख

3-निरीक्षण के समय किये जा रहे कार्य एवं नियोजित जनशक्ति का विवरण:-2 मिस्त्री,7 लेबर, 2 पेन्टर ,3 पलम्बर

4-कार्य की प्रथम दृष्ट्य गुणवत्ता:-संतोषजनक

5-तृतीय पार्टी जॉच (यदि हुई है) तो उक्त का निष्कर्ष:-नहीं

6-यदि सैम्पल लिये गये तो उक्त का परिणाम:-हां

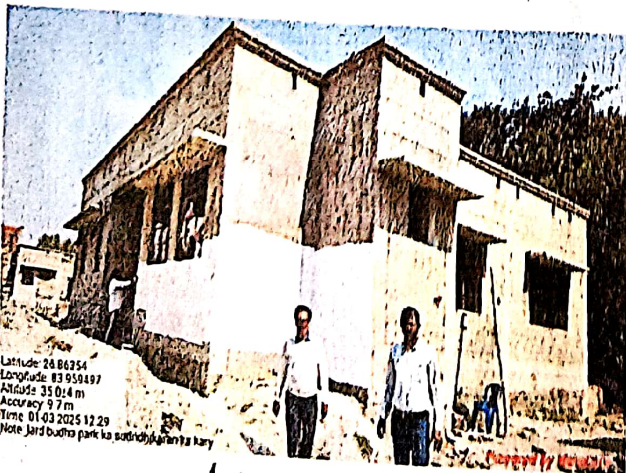

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कुशीनगर

5K
11/03/2025
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
कुशीनगर
