

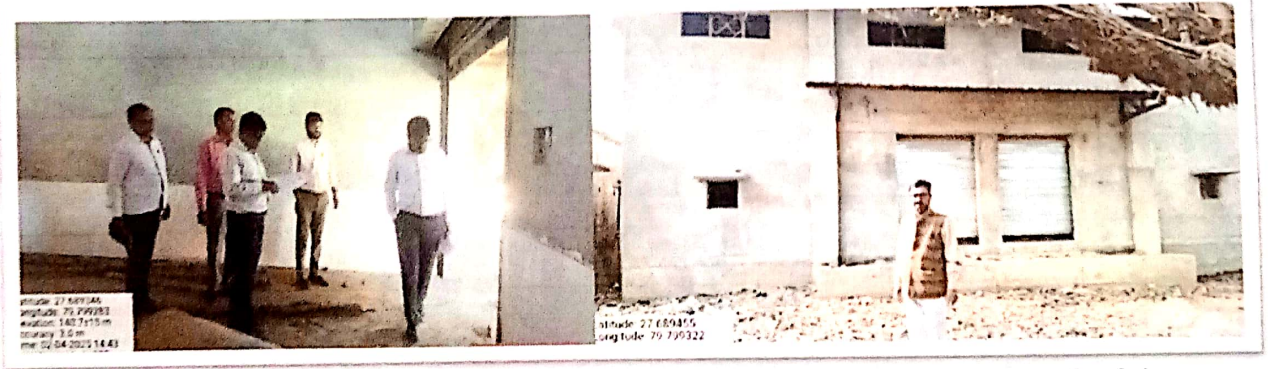
स्थलीय निरीक्षण आख्या

100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स कुरियाकलां, वि0खं0 कांट, शाहजहांपुर का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक : 2187 / 6-सह0 / गोदाम निर्माण / 2024-25 दिनांक 01 मार्च 2025 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्माणाधीन 100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स कुरियाकलां वि0खं0 कांट, शाहजहांपुर का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से दिनांक 02.04.2025 को किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण प्रखण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता श्री स्वप्निल तिवारी उपस्थित थे।


100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स कुरियाकलां वि0खं0 कांट, शाहजहांपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश 736-45 / गोदाम / आर0के0वी0वाई0 100-250 दि0 13 अक्टूबर 2023 के द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 45.46 लाख की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष रू0 31.40 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि परियोजना पर अब तक रू0 30.51 लाख व्यय किया जा चुका है।





वर्तमान में गोदाम में ट्रस व शीट लगाने का कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य पूर्ण, आफिस का प्लास्टर कार्य पूर्ण है, टायल्स का कार्य पूर्ण है। कार्य की भौतिक प्रगति 75% है। ~~मेन्टींग एवं इंटरलॉकिंग एवं इलेक्ट्रिकल कार्य शेष है।~~
100 एम0टी0 गोदाम बी-पैक्स कुरियाकलां वि0खं0 कांट, शाहजहांपुर का निर्माण कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।



सचिव
बी-पैक्स, कुरियाकलां
कांट, शाहजहांपुर।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
शाहजहांपुर।


अधिशाली अभियन्ता
उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0
शाहजहांपुर।


सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता, शाहजहांपुर


मुख्य विकास अधिकारी
शाहजहांपुर।


A. P. S. Sarker


S. S. S. S. S.
