


स्थलीय निरीक्षण आख्या

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शाहजहांपुर मुन0 बोर्ड, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त
छारमेट्री का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

जिलाधिकारी महोदय, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक : एम0एस0ए0/कं0जी0वी0बी0/7924-29/
2024-25 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शाहजहांपुर
मुन0 बोर्ड, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त छारमेट्री का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण प्रखण्ड
शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता उपस्थित थे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शाहजहांपुर मुन0 बोर्ड, शाहजहांपुर में अतिरिक्त छारमेट्री के निर्माण
कार्य हेतु शासनादेश 68-5099/220/2024-अनुभाग-5 (बैसिक शिक्षा)-Basic Education Department
दिनांक 31.07.2024 के द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए
रु0 32.15 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में
रु0 13.54 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि
प्रथम किशत का 80 प्रतिशत उपभोग किया जा चुका है।

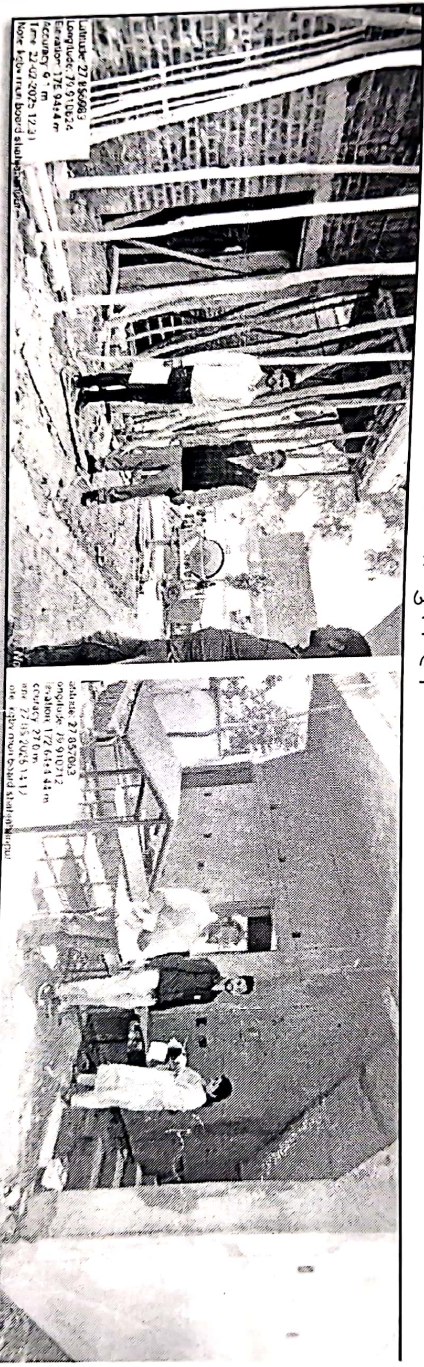

वर्तमान में भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण है। स्टेयरकेस का कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति 40
प्रतिशत है। भूतल पर प्लास्टर, टायल्स, रंगार्ड-पुतार्ड, आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य शेष है। प्रथम तल पर
सुपर स्ट्रक्चर कार्य, स्लैब एवं फिनीशिंग कार्य कराया जाना है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा
बताया गया कि अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर समस्त प्रस्तावित कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भावलखेड़ा, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त छारमेट्री कार्य
प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।

अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
शमजहापुर

अधिशाली अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड-1, शाहजहापुर

उप जिलाधिकारी
सदर,
शाहजहापुर
