


स्थलीय निरीक्षण आख्या

करसूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेद्री का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

जिलाधिकारी महोदय, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक : एमओएसओएओ/केओजीओवीओ/7924-29/2024-25 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा करसूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेद्री का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से दिनांक 22.03.2025 को किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था उओप्रओ राज्य निर्माण सहकारी संघ लिओ निर्माण प्रखण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता श्री अभिषेक वर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री अंकित वर्मा उपस्थित थे।

करसूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर, शाहजहांपुर में अतिरिक्त डारमेद्री के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश 68-5099/220/2024-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)-Basic Education Department दिनांक 31.07.2024 के द्वारा उओप्रओ राज्य निर्माण सहकारी संघ लिओ, को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रुओ 32.15 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रुओ 13.54 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि प्रथम किश्त का 80 प्रतिशत उपभोग किया जा चुका है।

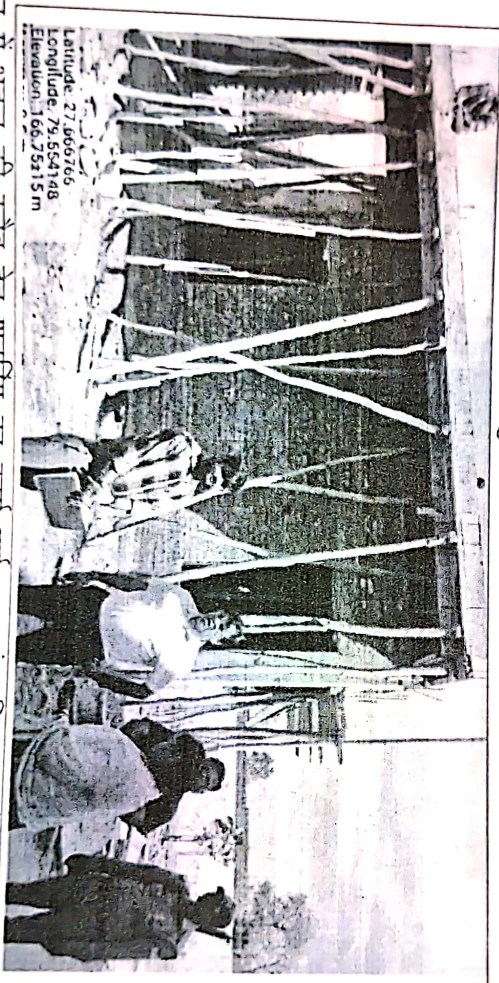

वर्तमान में भूतल की स्तैव हेतु शटरिंग का कार्य पूर्ण था एवं सरिया बांधने का कार्य चल रहा था। कार्य कार्य की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत है। कार्यस्थल पर मौके पर पड़ी हुई कुछ ईंटें सही नहीं प्रतीत हो रही थी, जिसे तत्काल हटाने एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

करसूरबा गांधी बालिका विद्यालय मिर्जापुर, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेद्री कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।

उप जिलाधिकारी
जलालाबाद,
शाहजहांपुर

अवर अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
शाहजहांपुर

अधिशाली अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
निर्माण खण्ड-1, शाहजहांपुर।
