


तकनीकी जाँच आख्या

कार्य का नाम :	जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय पुरवा में एकैडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास का निर्माण कार्य (कक्षा- 9 से 12 तक)
शासनादेश संख्या :	241/68-5-2020 दिनांक : 17.03.2020
कार्य की स्वीकृत लागत :	रु० 315.77 लाख
अवमुक्त धनराशि :	रु० 297.65 लाख

आज दिनांक : 27.03.2023 को जनपद उन्नाव में कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय पुरवा में एकैडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास का निर्माण कार्य (कक्षा - 9 से 12 तक) का स्थलीय निरीक्षण पत्रांक संख्या : के०जी०वी०वि०/उच्चैकरण/जोच/2023-24 दिनांक - 24.03.2023 के क्रम में कार्य का तकनीकी सत्यापन के समय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० लखनऊ निर्माण प्रखण्ड लखनऊ तृतीय के सहायक अभियन्ता श्री धनेश मौर्य व सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रहे।

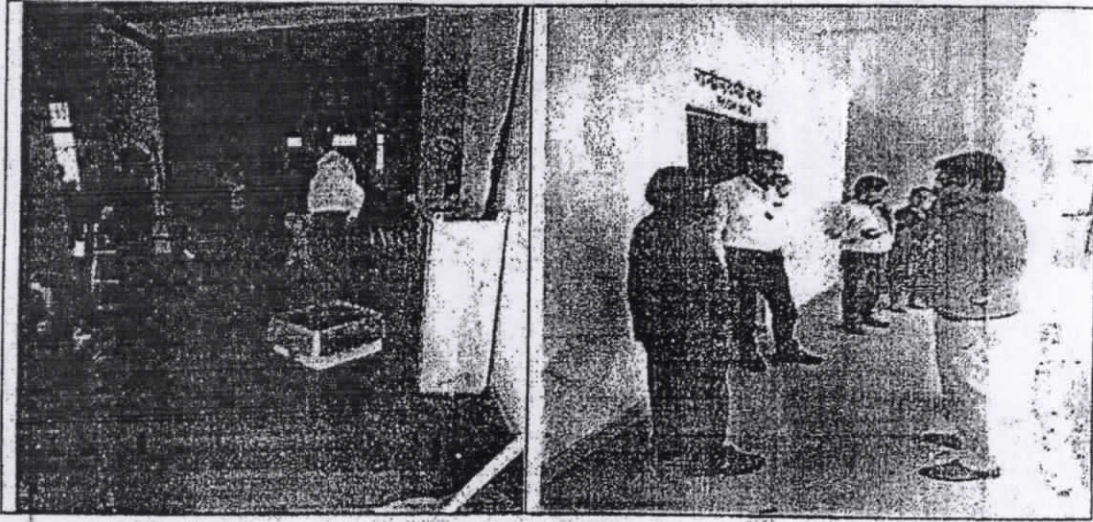

(क) प्राविधानित कार्य -

छात्रावास (भूतल)

रूम : 13 नग (साइज 3.37x6.30 मी० प्रति नग), बेडरूम : 01 नग (साइज 4.40x3.00 मी०) के साथ किचन (साइज 2.39x1.99 मी०), वार्डन आफिस - 01 नग (साइज 3.40x3.45 मी०), मेडिकल चेक - 01 नग (साइज 3.60x5.50 मी०), रिसेशन - 1 नग (साइज 3.60x5.50 मी०), डायनिंग - 1 नग (साइज 5.56x6.60 मी०), पैन्ट्री - 1 नग (साइज 2.30x1.87 मी०), किचन - 1 नग (साइज 3.20x3.10 मी०), स्टोर - 1 नग (साइज 1.67x2.03 मी०) के साथ 02 नग कॉमन टायलेट।

छात्रावास (प्रथम तल)

रूम : 13 नग (साइज 3.37x6.30 मी० प्रति नग), टायलेट - 02 नग (साइज 3.83x4.89 मी० प्रति नग)।

Signature

1. एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास में पेंटिंग कार्य पूर्ण पाया गया।
2. एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास में विद्युत वायरिंग, सेनेटरी फिटिंग, टाइल्स इत्यादि का कार्य पूर्ण एवं अलमारियों में पल्ले लगे पाये गये।
3. एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास का निर्माण कार्य मानकीकृत ड्राइंग के अनुसार कराया गया है।

(ग) भवन के निर्माण में निम्नलिखित कमियां पायीं गईं जिसके सुधार की आवश्यकता है:

1. भवनो के कमरों में सफाई के निर्देश दिये गये हैं।
2. कुछ कमरों में दरवाजे एवं खिड़कियां खुल नहीं रही थी जिसे ठीक करने का निर्देश दिये गये।
3. छात्रावास के आंगन में समतलीकरण का कार्य नहीं किया गया था, जिसे ठीक कराने के निर्देश दिये गये।
4. एकेडमिक ब्लॉक में फर्स की सीलन से दीवार की सतह पर पुताई कुछ खराब है, जिसे ठीक करने का निर्देश दिया गया।
5. एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास के बीच में समतलीकरण कार्य ठीक नहीं था जिसे ठीक करने का निर्देश दिया गया।
6. खिड़कियों में मच्छरजाली व रसोइघर, भवन में आवश्यकतानुसार इक्जास्ट लगाने के निर्देश दिये गये।

भवन में प्रयुक्त की गयी निर्माण सामग्री ईंट, मोर्टार, सी0सी0 क्यूब के नमूनों की तकनीकी जांच इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी लखनऊ, उ0प्र0 से करायी गयी है।

भवन में कराये गये कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक पायी गयी। उक्त कमियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् भवन को अधिग्रहण किया जा सकता है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
बि०ख० पुरवा उन्नाव

अधिसाषी अभियन्ता
नतकूल खण्ड
उन्नाव

परियोजना निदेशक,
डी०आर०डी०ए०
उन्नाव
