

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम	पशु चिकित्सालय सवायजपुर, हरदोई के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य।
कार्यदायी संस्था	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० निर्माण प्रखण्ड लखनऊ तृतीय
शासनादेश सं०	423(1)/सैंतीस-2/2025-1(35)/204टी०सी०1 दिनांक : 17.03.2025
स्वीकृत लागत	रु० 69.11 लाख
कुल अवमुक्त धनराशि	रु० 59.00 लाख
कुल व्यय धनराशि	रु० 59.00 लाख
अवशेष धनराशि	रु० 10.11 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि	16.05.2025

आज दिनांक : 04.12.2025 को पशु चिकित्सालय सवायजपुर, हरदोई के अनावासीय भवन निर्माण कार्य का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी महोदय जनपद हरदोई के पत्रांक संख्या : 852/आर०आई०डी०एफ० 30/नाबर्ड/2025-26 दिनांक : 24 अक्टूबर, 2025 के क्रम में किया गया है। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के समय निरीक्षण कमेटी के सदस्य तथा कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० निर्माण प्रखण्ड लखनऊ तृतीय के सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित ठेकेदार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्राविधानित कार्य -


पशु चिकित्सालय सवायजपुर, हरदोई के अनावासीय भवन का निर्माण कार्य।

कार्य का स्तर -

1. पशु चिकित्सालय भवन का स्लैब व प्लास्टर कार्य पूर्ण, वाटर प्रूफिंग एवं ब्रिककोबा कार्य पूर्ण एवं अवशेष कार्य प्रगति पर पाया गया।
2. इण्डोर वार्ड, कैटल ट्रफ का स्लैब एवं प्लास्टर कार्य पूर्ण तथा कैटल कस का स्लैब कार्य पूर्ण एवं अवशेष कार्य प्रगति पर।

टिप्पणी

निरीक्षण के समय संयुक्त कमेटी द्वारा कार्य को गुणवत्तापरक एवं तीव्रगति से कार्य को कराने हेतु निर्देशित किया गया। कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी।

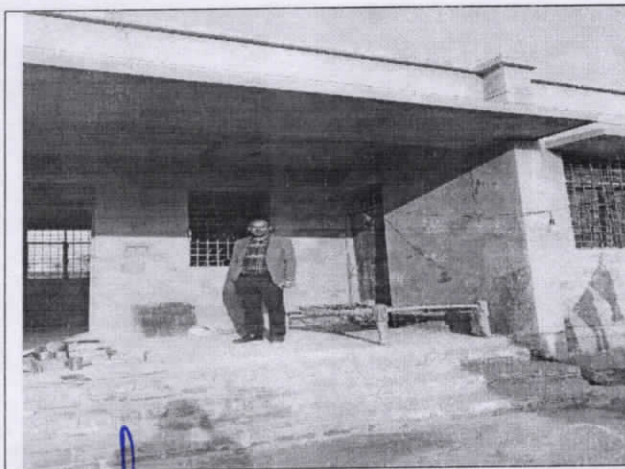

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण,
हरदोई

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हरदोई
