15

निरीक्षण आख्या

1– कार्य का नाम– जनपद कुशीनगर लार्ड बुद्धा पार्क रवीन्द्रनगर धूस में सुदृढ़ीकरण का कार्य।

2– डी0पी0आर0 के अनुसार कार्य का विवरण– जिम हाल ,टायलेट ब्लाक,गोडाउन कम ऑफिस ,पम्प हाउस,नाली, इण्टर लॉकिंग ,पाथवे,मिट्टी भराई,प्लान्टेशन, सोलर स्ट्रीट लाईट,बाउण्ड्रीवाल का जीर्णोद्धार।

3–विभाग– उद्यान विभाग

4–कार्यदायी संस्था– यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड गोरखपुर द्वितीय

5– स्वीकृत धनराशि (रू0 करोड़)–4.9969

6– अवमुक्त धनराशि–3.2622

7– कार्य आरम्भ की तिथि–16.03.2024 (अनुबन्ध के अनुसार) / 15.06.2024 (वास्तविक)

निरीक्षणः–

1– वर्तमान में भौतिक प्रगतिः–

(क)पूर्ण किये गये कार्य का विवरण :–

(फोटोग्राफ सहित)– जिम हाल – छत एवं बाहरी दिवार का प्लास्टर कार्य पूर्ण। आन्तरिक विद्युतीकरण,ब्रिक कोवा एवं प्लास्टर कार्य प्रगति पर।

टायलेट ब्लाक 1 – छत कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य प्रगति पर।

टायलेट ब्लाक 2 – छत स्तर तक ।

गोडाउन कम आफिस – छत कार्य पूर्ण।

पम्प रूम –प्लिन्थ स्तर तक प्रगति पर। मिट्टी भराई का कार्य प्रगति पर।

(ख) प्रतिशत (भौतिक प्रगति का):–40% (लगभग)

2– उपभोग की गयी धनराशि :–149.15 लाख

3–निरीक्षण के समय किये जा रहे कार्य एवं नियोजित जनशक्ति का विवरणः–6 मिस्त्री,11 लेबर,सटरिंग टीम–6 मिस्त्री

4–कार्य की प्रथम दृष्टय गुणवत्ताः–संतोषजनक

5–तृतीय पार्टी जॉच (यदि हुई है) तो उक्त का निष्कर्षः–नहीं

6–यदि सैम्पल लिये गये तो उक्त का परिणामः–हां

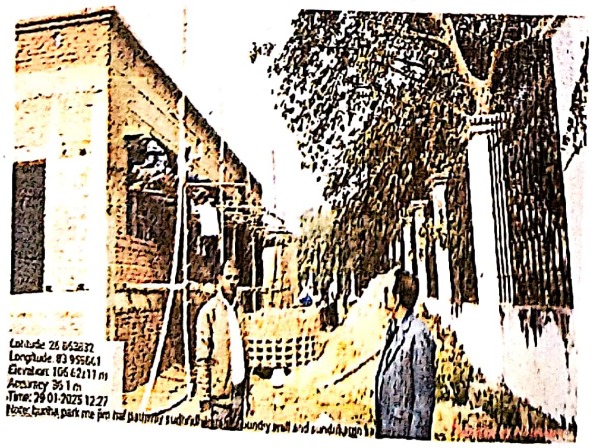

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कुशीनगर

SK
29/11/2025
जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी
कुशीनगर

Scanned with OKEN Scanner
